



001025



LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
FINANCIERA PARA EL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

(CUARTO TRIMESTRE 2025)

Ente Público: Gobierno Municipal de Nativitas

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 26,689,621.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR.	\$ 1,185,938.01	TLAXCALA	NATIVITAS	VARIAS LOCALIDADES	253.00 PZAS	1,265.00
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA, MUNICIPIO DE NATIVITAS	\$ 209,305.99	TLAXCALA	NATIVITAS	NATIVITAS	91.15 ML	20.00
AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,251,359.23	TLAXCALA	NATIVITAS	GUADALUPE VICTORIA	1580.47M2	600.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE QUIMIXTLA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	\$ 18,315.80	TLAXCALA	NATIVITAS	GUADALUPE VICTORIA	9.30 ML	40.00
REHABILITACIÓN EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	\$ 105,544.69	TLAXCALA	NATIVITAS	GUADALUPE VICTORIA	20.00 ML	990.00
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE JESUS TEPACTEPEC	\$ 471,138.28	TLAXCALA	NATIVITAS	JESUS TEPACTEPEC	1.00 POZO	3,179.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE JESÚS TEPACTEPEC	\$ 1,285,898.45	TLAXCALA	NATIVITAS	JESUS TEPACTEPEC	1,381.49	75.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ CAPULA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA.	\$ 356,173.78	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN BERNABE CAPULA	247.60 M	30.00
REHABILITACIÓN EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE CAPULA	\$ 518,694.13	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN BERNABE CAPULA	1.00 POZO	1,050.00
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZADA SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ CAPULA, NATIVITAS, TLAXCALA	\$ 731,137.41	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN BERNABE CAPULA	883.82 M2	30.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PAJARITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE CAPULA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA	\$ 126,661.34	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN BERNABE CAPULA	68.7 M	30.00
AUTOMATIZACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPACTEPEC	\$ 648,482.61	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN FRANCISCO TEPACTEPEC	1.00 POZO	960.80

PRESENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.

C.C.P. A. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE

Nativitas

2024 - 2027

"Un Gobierno Justo y Transparente"

TESORERÍA MUNICIPAL

NATIVITAS, TLAX.


2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.

2024 - 2027



001026



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TENXYECAC	\$ 616,010.30	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN FRANCISCO TENXYECAC	594.61 M2	40.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TENXYECAC	\$ 128,281.41	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN FRANCISCO TENXYECAC	80.00 ML	20.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOYATENCO	\$ 1,910,415.51	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN JOSE ATOYATENCO	532.50 M2	1,850.00
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ANALCO	\$ 1,971,063.91	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	1936.65 M2	75.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TLAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ANALCO	\$ 88,296.65	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	90.60 ML	75.00
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA.	\$ 780,025.90	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	1.00 POZO	1,100.00
REHABILITACIÓN DE ESCALINATA EN PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA.	\$1,537,498.64	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	119.28 M2	1,100.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	\$ 1,951,723.60	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	587.40 M2	2,195.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE TLAHUICOLE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATIVITAS, TLAXCALA.	\$ 623,064.63	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	458.09 M2	175.00
REHABILITACIÓN EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA	\$ 556,995.74	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	1.00 POZO	1,855.00
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA PARA RIEGO EN CALLE REFORMA Y CALLE LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA	\$ 248,778.15	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	253.00 ML	50.00
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA.	\$ 2,085,747.88	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	1.00 POZO	3,050.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA	\$ 59,432.02	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTA MARÍA NATIVITAS	49.00 ML	45.00
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CRISTO REY Y LA VEREDA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA	\$ 522,945.99	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTA MARÍA NATIVITAS	788.10 ML	2,250.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA VEREDA Y CAMINO A SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA	\$ 136,536.28	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTA MARÍA NATIVITAS	127.50 ML	20.00

C.C.B. Archivo

NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027H. AYUNTAMIENTO DE NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

Nativitas

2024 - 2027

"Un Gobierno. Justo y Transparente"

SECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



001027



AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN MARIANO MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA.	\$ 156,614.76	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	172.50 ML	10.00
EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDADES DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	\$ 937,500.40	TLAXCALA	NATIVITAS	VARIAS LOCALIDADES	200.00 PIEZAS	1,000.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE TLAXCALA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA.	\$ 1,304,273.67	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANYECAC	162.30	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE LA VEREDA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA	\$ 997,475.83	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	907.66 ML	45.00
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE RIEGO DEL POTRERO 25 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC	\$ 255,353.28	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	1.00 POZO	2,250.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILADO PLUVIAL EN CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA	\$ 20,285.23	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	10.30 ML	40.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA.	\$ 771,514.90	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	814.76 M2	175.00
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA.	\$ 61,470.53	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	100.00 ML	60.00
REHABILITACIÓN EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA DE SAN MIGUEL TLALE DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA	\$ 463,329.84	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	1.00 POZO	960.00
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA (PRIMERA ETAPA)	\$ 1,596,336.22	TLAXCALA	NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	308.70 M2	2,000.00

Monto de rendimientos financieros: \$

91,418.64

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	\$ 91,418.64	TLAXCALA	NATIVITAS	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	1 POZO	2,200.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027LIC. OSCAR MORALES IBÁÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONALDRA. LOURDES SALAZAR GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPALL.A.P. BLANCA ESTELA CASTILLO TREJO
C- TESORERO MUNICIPALDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

C.C.P. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO DE

Nativitas

2024 - 2027

"Un Gobierno, Justo y Transparente"

PLANTILLAEG CONACULTA 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SRFT														
Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recui	Tipo de Recurs	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presi	Programa Fon	Institucion Eje	Rendimiento F	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado
29	23	1	2024	2	23 U		83 Apoyo a munic		1	35.74	0			
		2											2	614 98929.25

PLANTILLAEG FISM 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SRFT														
Entidad	Municipio	Tipo de Registr	Ciclo de Recur	Tipo de Recurs	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presi	Programa Fon	Institucion Eje	Rendimiento F	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado
29	23	1	2025	2	33 I		4 FAIS MUNICIP.		1	91418.64	0			
		2											2	613 8667848.4
		2											2	614 5700000
		2											2	615 10301772.6
		2											2	617 2000000

PLANTILLAEG FORTAMUN 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SRFT														
Entidad	Municipio	Tipo de Registr	Ciclo de Recur	Tipo de Recurs	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presi	Programa Fon	Institucion Eje	Rendimiento F	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado
29	23	1	2025	2	33 I		5 FORTAMUN		1	440.95	0			
		2											1	113 13497949.6
		2											1	223 0
		2											1	246 0
		2											1	254 90000
		2											1	261 3000000
		2											1	271 6000000
		2											1	282 0
		2											1	296 0
		2											1	311 4800000
		2											1	345 0
		2											1	355 350000
		2											1	357 1055000
		2											1	392 220000
		2											1	519 0
		2											1	541 0
		2											1	542 0
		2											1	551 0
		2											1	563 1000000
		2											1	565 300000
		2											1	567 0
		2											1	569 0
		2											2	611 0
		2											2	614 0



SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001028

Modificado	Recaudado(M	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
98973.69	98973.69	98929.25	0	0	0			OBRAS POR PRIORIZAR OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ZONA DE ACCESO A MUSEOS

Modificado	Recaudado(M	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
8109828.93	8109828.93	8109828.93	8109828.93	8109828.93	8109828.93			OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE ALCANTARILLADO Y ELECTRIFICACIÓN
8247333.2	8247333.2	8247333.2	8247333.2	8247333.2	8247333.2			OBRAS DE URBANIZACIÓN
8280439.1	8280439.1	8280439.1	8280439.1	8280439.1	8280439.1			OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN
2123438.41	2123438.41	2123438.41	2123438.41	2123438.41	2123438.41			EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE CALENTADOR SOLAR

Modificado	Recaudado(M	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
8068311	8068311	8068311	8068311	8068311	8068311			Sueldos y salarios a personal de seguridad pública
6683	6683	6683	6683	6683	6683			Materiales, accesorios y suministros medicos
12436.65	12436.65	12436.65	12436.65	12436.65	12436.65			Materiales, accesorios y suministros medicos
0	0	0	0	0	0			Materiales, accesorios y suministros medicos
2873000.95	2873000.95	2873000.95	2873000.95	2873000.95	2873000.95			Adquisición de combustibles
0	0	0	0	0	0			Adquisición de uniformes para policias
25404	25404	25404	25404	25404	25404			Adquisición de alarmas vecinales en varias localidades
2105.4	2105.4	2105.4	2105.4	2105.4	2105.4			Adquisición de accesorios para compactador
5506961.84	5506961.84	5506961.84	5506961.84	5506961.84	5506961.84			Pago de energía eléctrica para alumbrado público
22550	22550	22550	22550	22550	22550			Seguro de Vienes Patrimoniales (Ambulancia)
1802974.07	1802974.07	1802974.07	1802974.07	1802974.07	1802974.07			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
312444.81	312444.81	312444.81	312444.81	312444.81	312444.81			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
214636	214636	214636	214636	214636	214636			Derechos por uso y aprovechamiento de agua
8995	8995	8995	8995	8995	8995			Mobiliario y equipo en área administrativa de seguridad pública
5927700	5927700	5927700	5927700	5927700	5927700			Adquición de vehículos (Patrulla, ambulancia y compactador)
1080320	1080320	1080320	1080320	1080320	1080320			Carrosería y remolques (Compactador)
0	0	0	0	0	0			Adquisición de equipo para policias
0	0	0	0	0	0			Adquisición maquinaria y equipo de construcción
118743.4	118743.4	118743.4	118743.4	118743.4	118743.4			Adquisición de equipo de radiocomunicación
36383.4	36383.4	36383.4	36383.4	36383.4	36383.4			Herramientas y máquinas-herramienta para patrullas
33027.52	33027.52	33027.52	33027.52	33027.52	33027.52			Equipamiento de bienes para patrulla
29753.54	29753.54	29753.54	29753.54	29753.54	29753.54			Mantenimiento de maquinaria en la comandancia
1187368.37	1187368.37	1187368.37	1187368.37	1187368.37	1187368.37			División de terrenos para obras de urbanización

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001029

001030

EVIDENCIAS PLANTILLAS

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Hacienda
MST

Carga Ejercicio del Gasto

Información de carga

- Inicio validación del archivo: plantillaE FISM 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SRFT.csv
- >La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- >Total de registros validados 1.
- >El identificador de carga es: 503,350.

Historial de cargas

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
503350	Hace un momento	plantillaE FISM 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SRFT.csv	Terminado	No disponible		No disponible
482383	24/07/2025 12:13:34 PM	plantillaE FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2024 NATIVITAS.csv	Terminado	->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->Total de registros validados 1	Descargar todos	Eliminar

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001033

REGISTRO DE OTROS PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE

https://www.mt.hacienda.gob.mx/... Seguimiento de los Recursos Federales

https://www.mt.hacienda.gob.mx/... Seguimiento de los Recursos Federales

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MEIS

Porcentaje

Tipo: Gestión Sentido: Descendente

Linea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDO TRIMESTRE	0	0	2	0	0	2	0	0	1
TERCER TRIMESTRE	0	0	20	0	0	20	0	0	12
CUARTO TRIMESTRE	0	0	9	0	0	9	0	0	26

Inicio Cancelar Solicitar Validación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA ARCA DE EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN NATIVITAS, TLAX. 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL NATIVITAS, TLAX. 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS NATIVITAS, TLAX. 2024 - 2027

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Hacienda MST

Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información

Información de carga

- Inicio validación del archivo: plantillaEG FORTAMUN 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SRFT.csv
- La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- Total de registros validados 1.
- El identificador de carga es: 505,603.

Historial de cargas

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
505603	Hace un momento	plantillaEG FORTAMUN 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SRFT.csv	Terminado	No disponible		No disponible
503330	14/01/2026 02:48:34 PM	plantillaEG FISM 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SRFT.csv	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.	Descargar archivo	Eliminar

14°C Soleado 12:24 p.m. 13/01/2026

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL NATIVITAS, TLAX. 2024 - 2027

AVANCE DE INDICADORES

PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA

https://www.mst.hacienda.gob.mx/Seguimiento de los Recursos Fe...

ID: 197220 Nivel: Componente

Nombre: Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública Unidad de Medida: Porcentaje

Tipo: Estratégico Sentido: Ascendente

Método de Cálculo: (Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

Línea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
SEGUNDO TRIMESTRE	33.64206	9173925	27269358	33.64206	9173925	27269358	48.70733	6641087	13634676
CUARTO TRIMESTRE	67.28413	18347949	27269358	67.28413	18347949	27269358	62.70132	17698248	27269358

Inicio Cancelar Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DERECHOS RESERVADOS © 2014 POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
INTEGRALES CIUDAD
2024 - 2027

https://www.mst.hacienda.gob.mx/Seguimiento de los Recursos Fe...

ID: 199540 Nivel: Componente

Nombre: Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura Unidad de Medida: Porcentaje

Tipo: Estratégico Sentido: Ascendente

Método de Cálculo: (Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

Línea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
SEGUNDO TRIMESTRE	2.94545	803204	27269358	2.94545	803204	27269358	1.43849	795042	13634676
CUARTO TRIMESTRE	5.89089	1606409	27269358	5.89089	1606409	27269358	4.50732	1279118	27269358

Inicio Cancelar Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DERECHOS RESERVADOS © 2014 POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Buscar

INDICADOR MUNICIPAL
NATIVITAS, FLAX.
2024 - 2027

001035

PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL

Seguimiento de los Recursos Federales

https://www.mshacienda.gob.mx/.../avances/.../2024-2027

ID: 200072 **Nivel:** Componente **Método de Cálculo:** (Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100

Nombre: Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local **Unidad de Medida:** Porcentaje

Tipo: Estratégico **Sentido:** Ascendente

Línea Base:

Avances:

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
SEGUNDO TRIMESTRE	0	0	27269358	0	0	27269358	0	0	13634676
CUARTO TRIMESTRE	0	0	27269358	0	0	27269358	0	0	27269358

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

AL CUARTO TRIMESTRE NO SE REALIZARON PAGOS DE DESCARGAS

Seguimiento de los Recursos Federales

https://www.mshacienda.gob.mx/.../avances/.../2024-2027

ID: 197430 **Nivel:** Componente **Método de Cálculo:** (Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100

Nombre: Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales **Unidad de Medida:** Porcentaje

Tipo: Estratégico **Sentido:** Ascendente

Línea Base:

Avances:

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
SEGUNDO TRIMESTRE	0.40338	110006	27269358	0.40338	110006	27269358	0	0	13634676
CUARTO TRIMESTRE	0.80677	220006	27269358	0.80677	220006	27269358	0	0	27269358

Inicio Cancelar Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

09:32 p.m. 15/01/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA

Seguimiento de los Recursos Financieros

190087

Compendio

Método de Cálculo

Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua - Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta * 100

Nombre

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Sentido

Ascendente

Linea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
SEGUNDO TRIMESTRE	0	0	27269358	0	0	27269358	0	0	13634676
CUARTO TRIMESTRE	0	0	27269358	0	0	27269358	0.7871	214636	27269358

Inicio Cancelar Solicitar Validación

PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

Presidencia Municipal Nativitas, Tlax.

2024 - 2027

190076

Compendio

Método de Cálculo

Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras - Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta * 100

Nombre

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Sentido

Ascendente

Linea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
SEGUNDO TRIMESTRE	18.00911	3547500	27269358	18.00911	3547500	27269358	24.87533	3392107	13634676
CUARTO TRIMESTRE	26.01821	7095000	27269358	26.01821	7095000	27269358	32.90425	8727356	27269358

Inicio Cancelar Solicitar Validación

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001037

PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Seguimiento de los Recursos Financieros

Porcentaje de recursos Fortamun recibidos por municipios y demarcación

Tipo: Ubicación Sentido: Ascendente

Línea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	25	6817340	27269358	25	6817340	27269358	12.65721	3451546	27269358
SEGUNDO TRIMESTRE	25	6817340	27269358	25	6817340	27269358	40.99999	13634676	27269358
TERCER TRIMESTRE	25	6817339	27269358	25	6817339	27269358	14.99998	20452014	27269358
CUARTO TRIMESTRE	25	6817339	27269358	100	27269358	27269358	100	27269358	27269358

Inicio Cancelar Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

PRESIDENCIA MUNICIPAL NATIVITAS, TLAX. 2024 - 2027

Nivel: Progresivo

Unidad de Medida: Otro

Tipo: Estratégico Sentido: Descendente

Línea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
SEGUNDO TRIMESTRE	0.5	13634679	27269358	0.5	13634679	27269358	2.31997	13634676	5827096
CUARTO TRIMESTRE	0.5	13634679	27269358	0.5	13634679	27269358	3.70508	27269358	7360000

Inicio Cancelar Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 3.0

17°C Parc. soleado 05:49 p.m. 15/01/2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS NATIVITAS, TLAX. 2024 - 2027

TEORÍA MUNICIPAL NATIVITAS, TLAX. 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL NATIVITAS, TLAX. 2024 - 2027

ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS

Seguimiento de los Recursos Fe

Índice en el ejercicio de recursos

Tipo: Gestión Sentido: Ascendente

Línea Base

Avances

Período	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	25	6817340	27209358	25	6817340	27209358	12.65723	3451546	27209358
SEGUNDO TRIMESTRE	25	6817340	27209358	25	6817340	27209358	37.90817	10228236	27209358
TERCER TRIMESTRE	25	6817339	27209358	25	6817339	27209358	62.54374	16955276	27209358
CUARTO TRIMESTRE	25	6817339	27209358	25	6817339	27209358	100	27209358	27209358

Inicio Cancelar Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

CONACULTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL NATIVITAS, TLAX.

2024 - 2027

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

TESORERÍA MUNICIPAL NATIVITAS, TLAX.

2024 - 2027

Carga Ejercicio del Gasto

Información de carga

- Iniciando validación del archivo: plantillasG CONACULTA 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SHFT.csv
- La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- Total de registros validados: 1.
- El identificador de carga es: 507589.

Historial de cargas

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
507589	Hace un momento	plantillasG CONACULTA 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SHFT.csv	Terminado	No disponible		No disponible
508403	15/01/2026 12:24:08 PM	plantillasG FORTAMUN 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SHFT.csv	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. Total de registros validados: 1.	Descargar archivo	Eliminar
508350	14/01/2026 02:46:54 PM	plantillasG FISM 4TH TRIM 2025 NATIVITAS SHFT.csv	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se	Descargar archivo	Eliminar

TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Registro de avances

Datos del indicador

ID	Nivel	Método de Cálculo
200437	Propósito	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t.) / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1: 1:17100
Nombre	Unidad de Medida	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial	Porcentaje	
Tipo	Sentido	
Estratégico	Ascendente	

Línea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
CUARTO TRIMESTRE	8.91323	115076133	105658540	8.91323	115076133	105658540	44.18717	58971024	105658540

Inicio Cancelar Solicitar Validación


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

[illegible]

001041

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250202535324

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Cancelación

FAIS2523012

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.

Desarrollo

Termino

9°C Despejado 11:05 a.m. 12/01/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEOPHILA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001042

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250302588783

Cancelar Anterior Solicitar Validación

FAIS2523026

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.

2024 - 2027

Desarrollo

Termino

TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX
2024 - 2027



SINDICATO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX
2024 - 2027



TEOQUEMILCÁN MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX
2024 - 2027




PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX
2024 - 2027



001043

001044



FAIS2523038

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.

2024 - 2027



Desarrollo



Termino




TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.


SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



001045




FAIS2523008

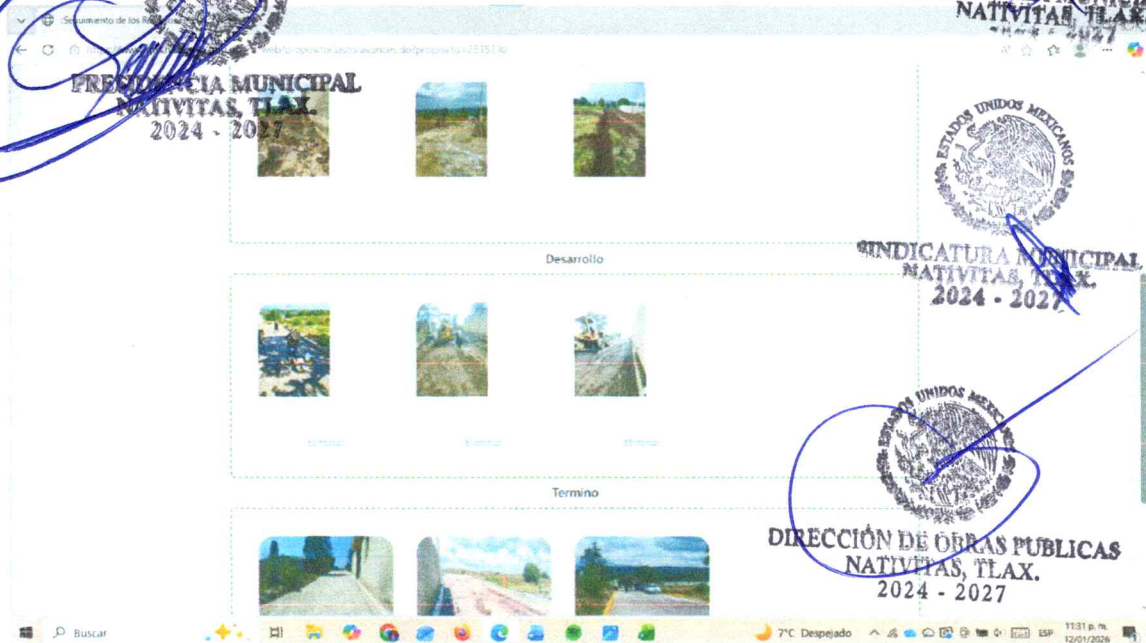

001046



001047



FAIS2523041

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



Desarrollo



Termino




TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001048



FAIS25286

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



Desarrollo



Termino




TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001049



FASI2523022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



Eliminar



Eliminar



Eliminar

Desarrollo



Eliminar



Eliminar



Eliminar



Termino




TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027




FA182523069

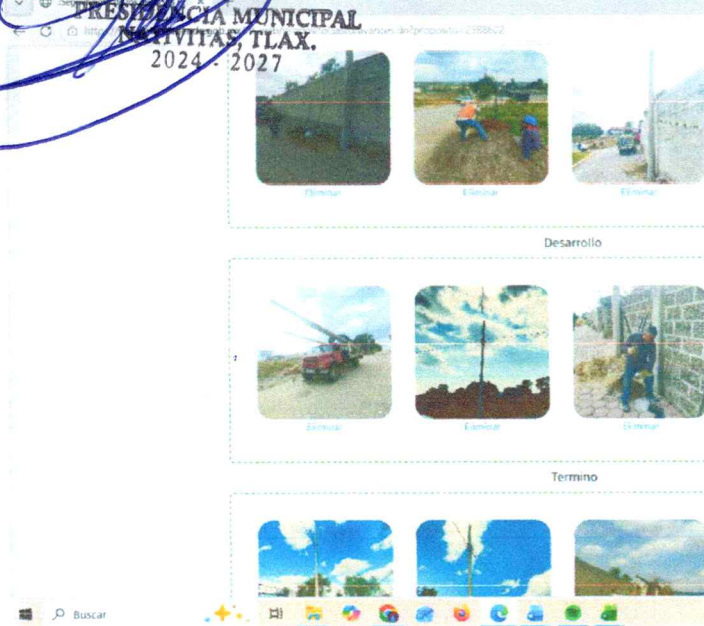





FAIS2523084

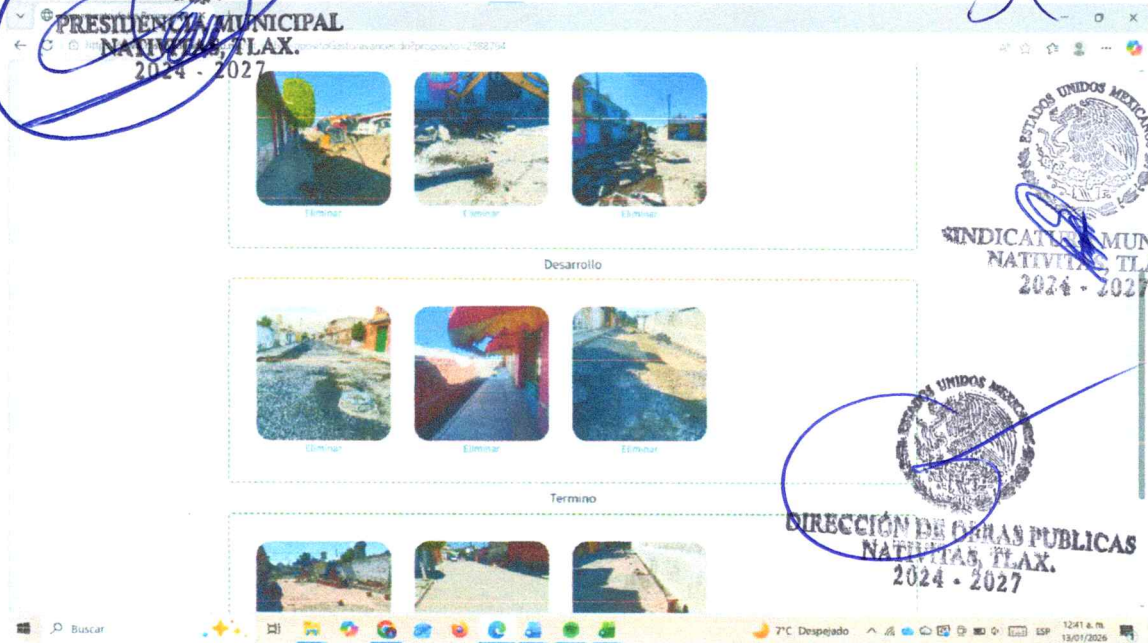


TEODORA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

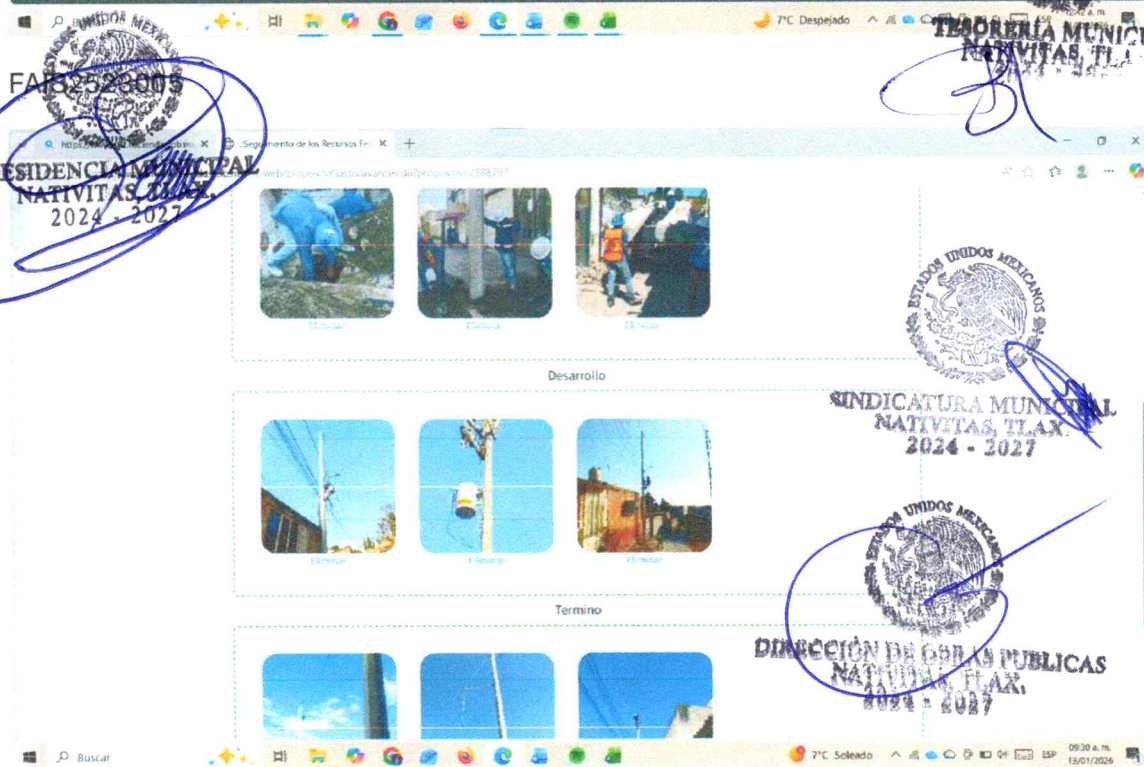


001053



FAIS2623015

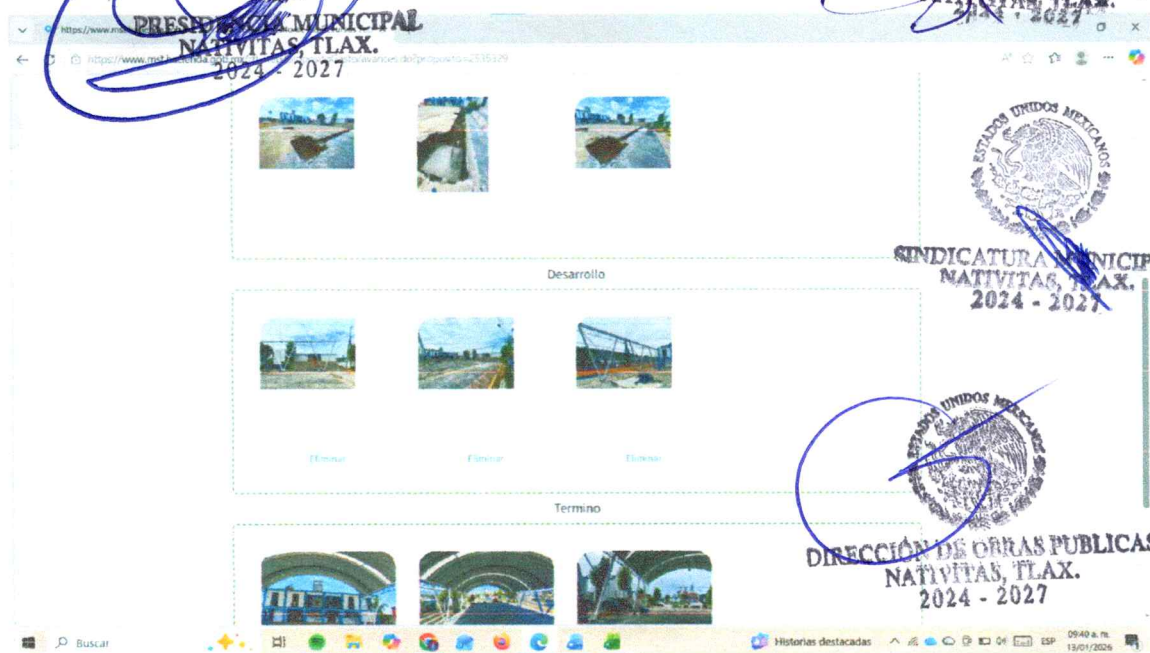

001054



FAIS2523014

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



Desarrollo



Termino




TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


001055



FAIS2523037

SECRETARÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.


SECRETARÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

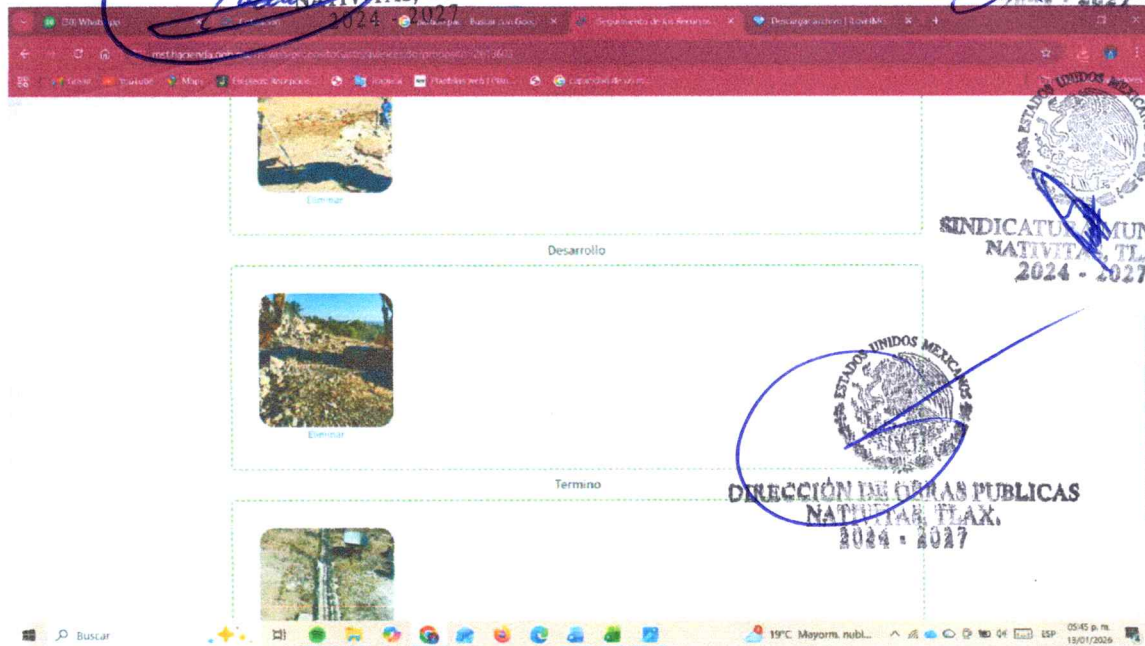

SINDICATO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001056




FAIS2523001

VICTORIA CALENTADORES

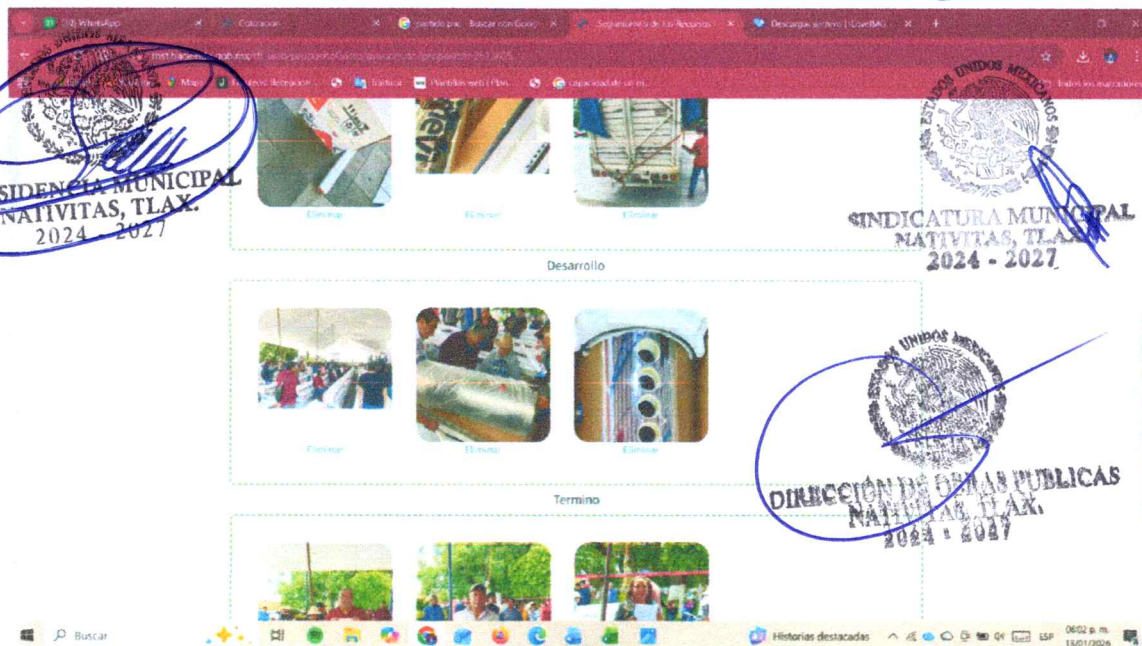


001057




FAIS2523001

ATOYATENCO CALENTADORES


TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.

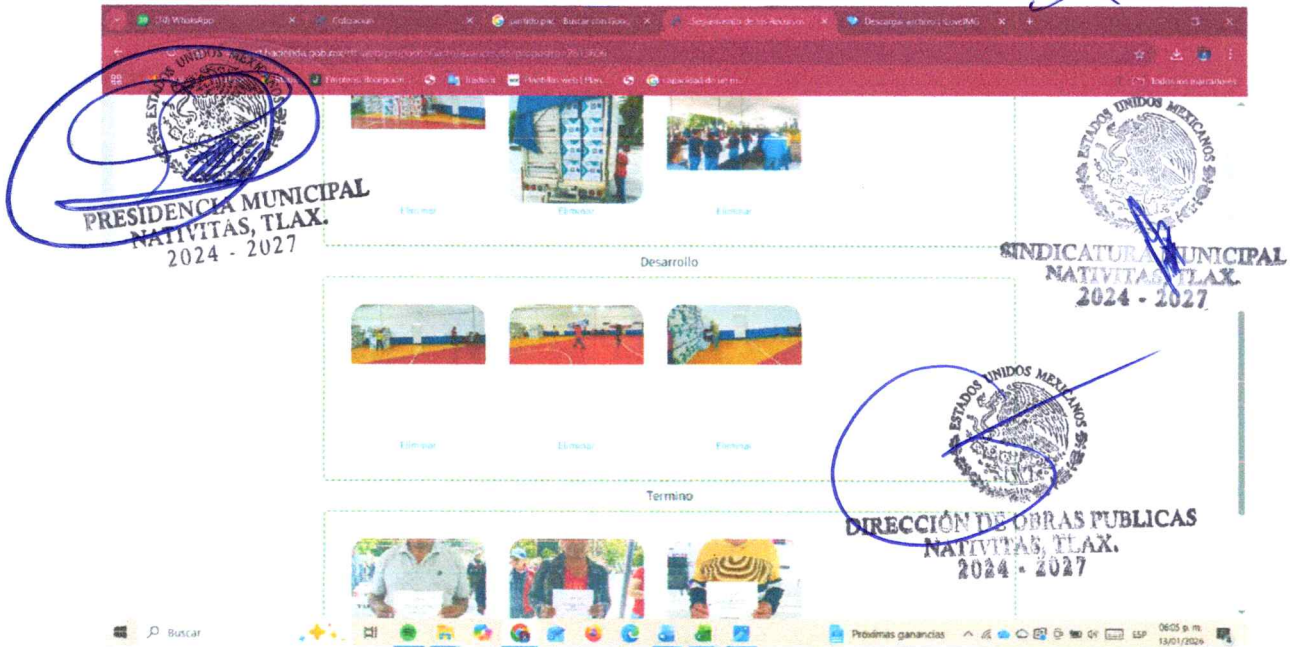


001058



FAIS2523026

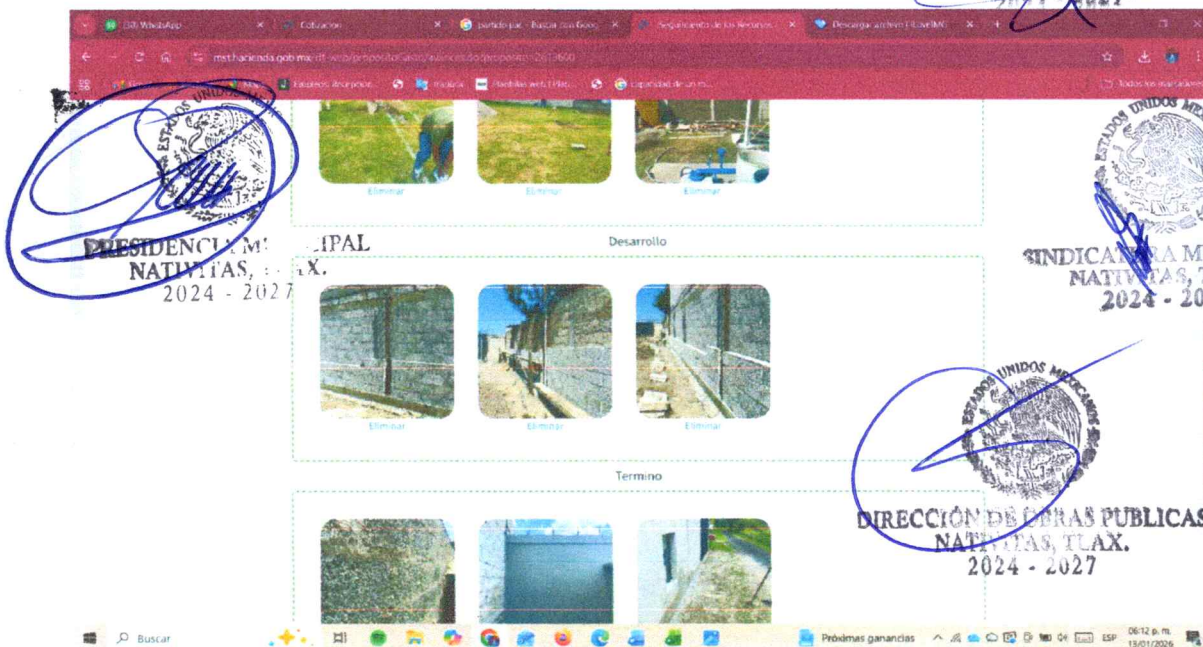


001059



FAIS2523025

TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

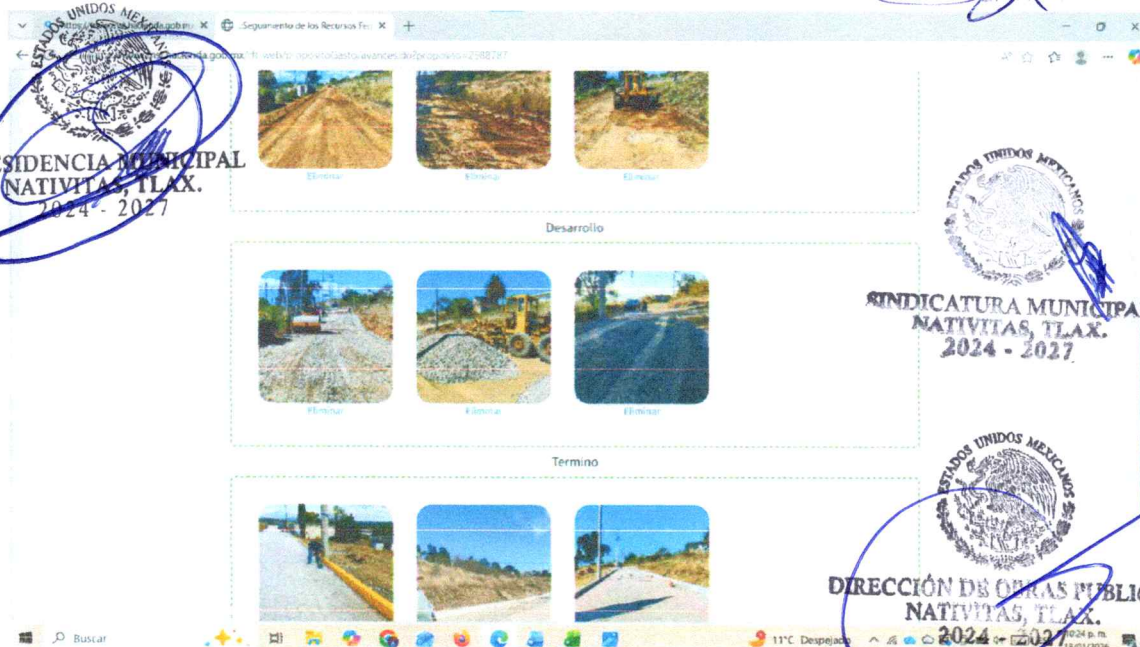

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001060




FAIS2523001

SAN MIGUEL DEL MILAGRO CALENTADORES



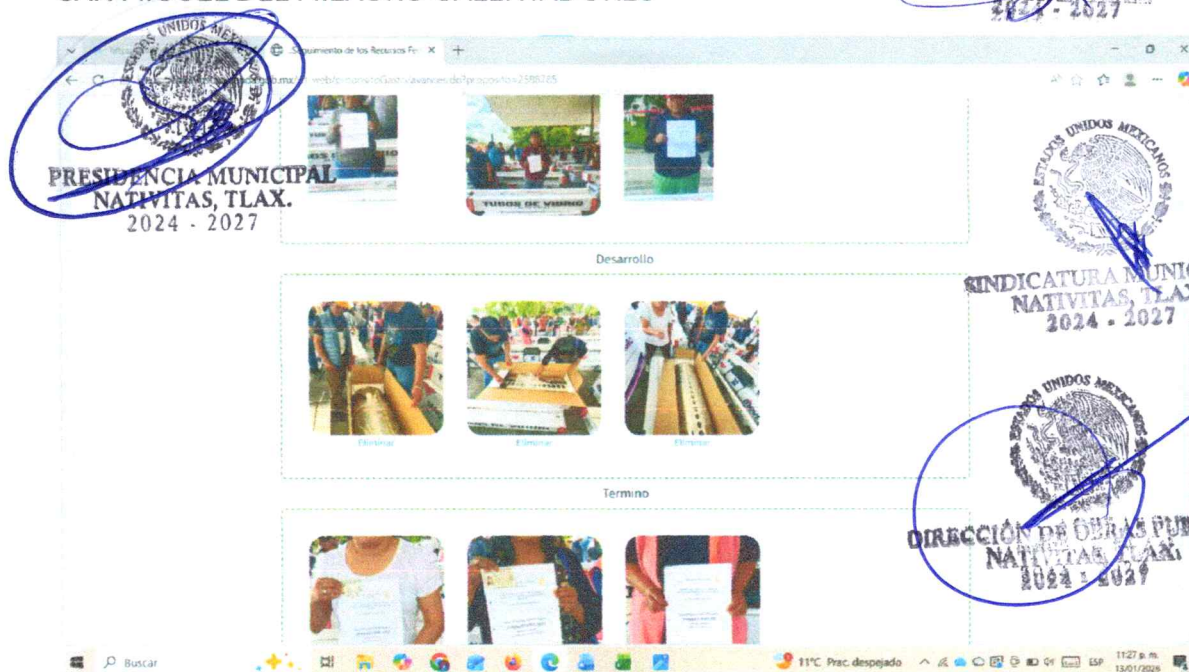


001061




FAIS2523023

MICHAC CALENTADORES

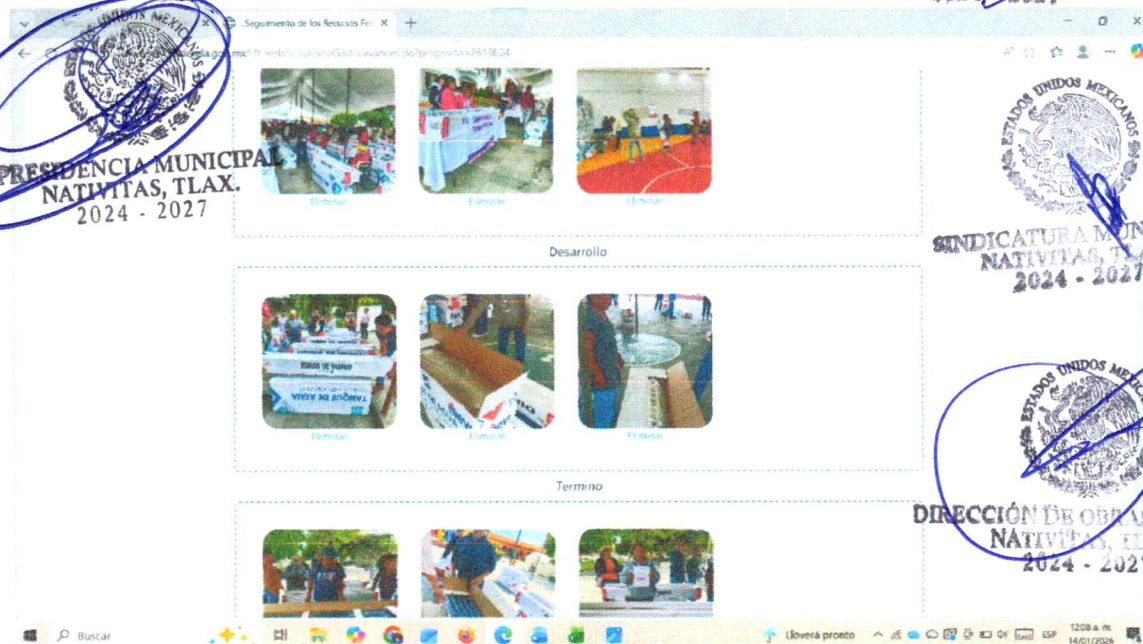



001062




FAIS2523023


CONCORDIA CALENTADORES

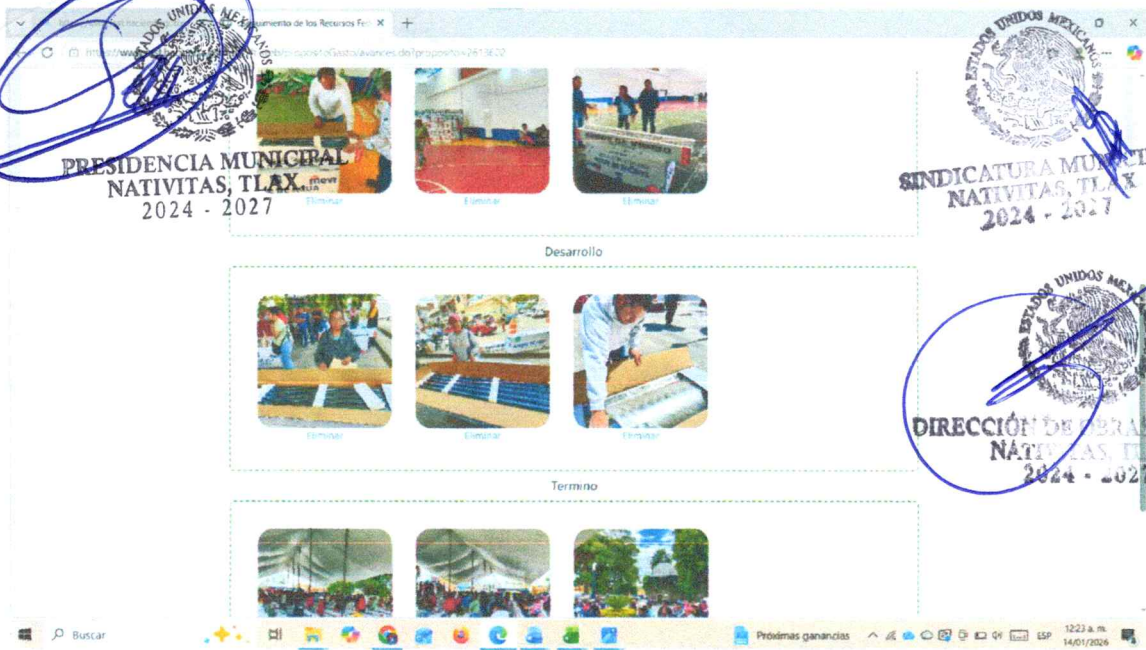


001063




FAIS2523033

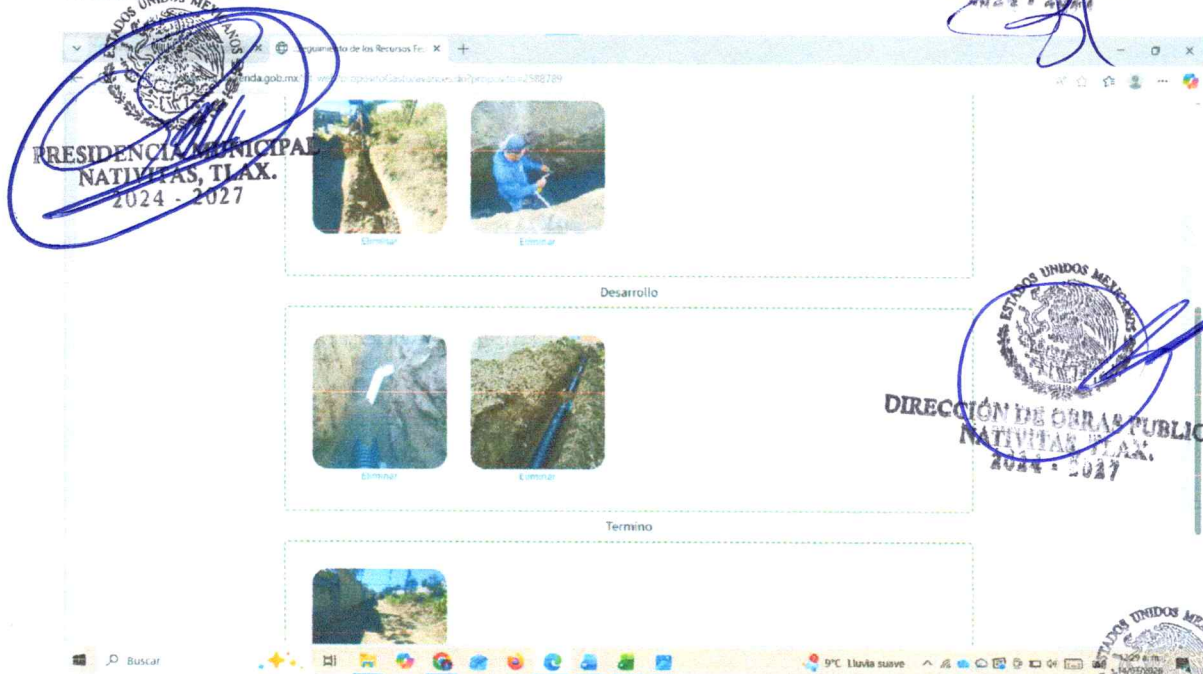

001064



FAIS2523028

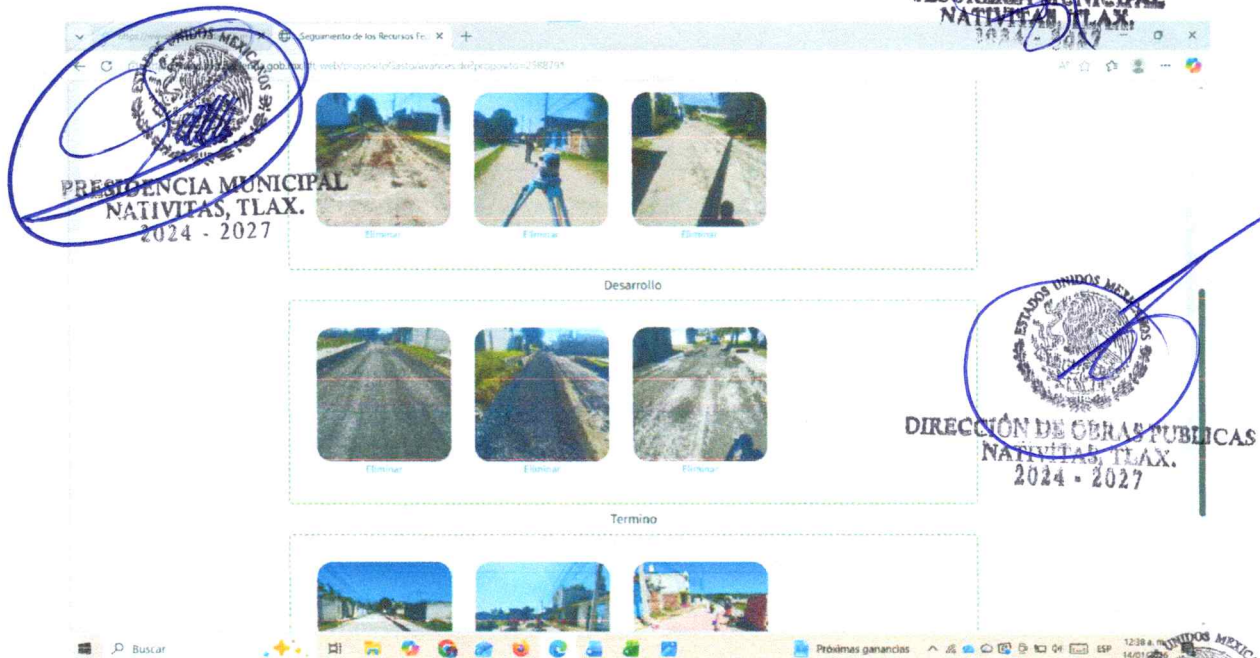

TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.


2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001066



FAIS2523027 CALLE REFORMA CONCORDIA

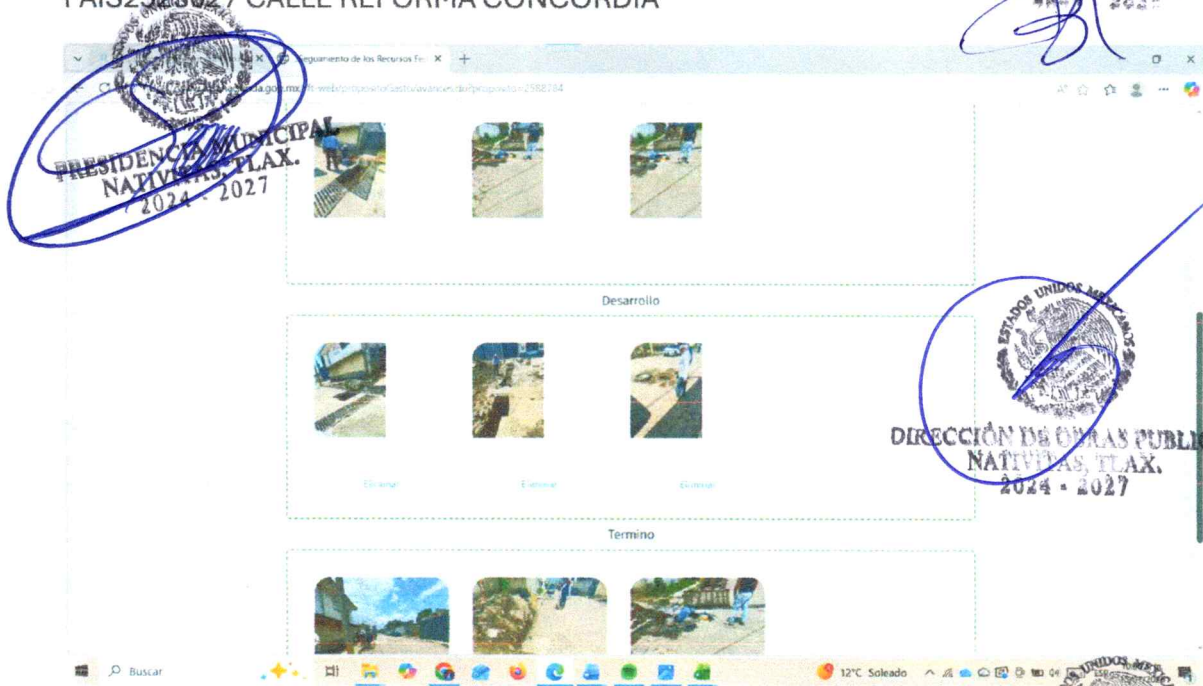


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001067



FAIS2523027 CALLE QUIMIXTLA VICTORIA

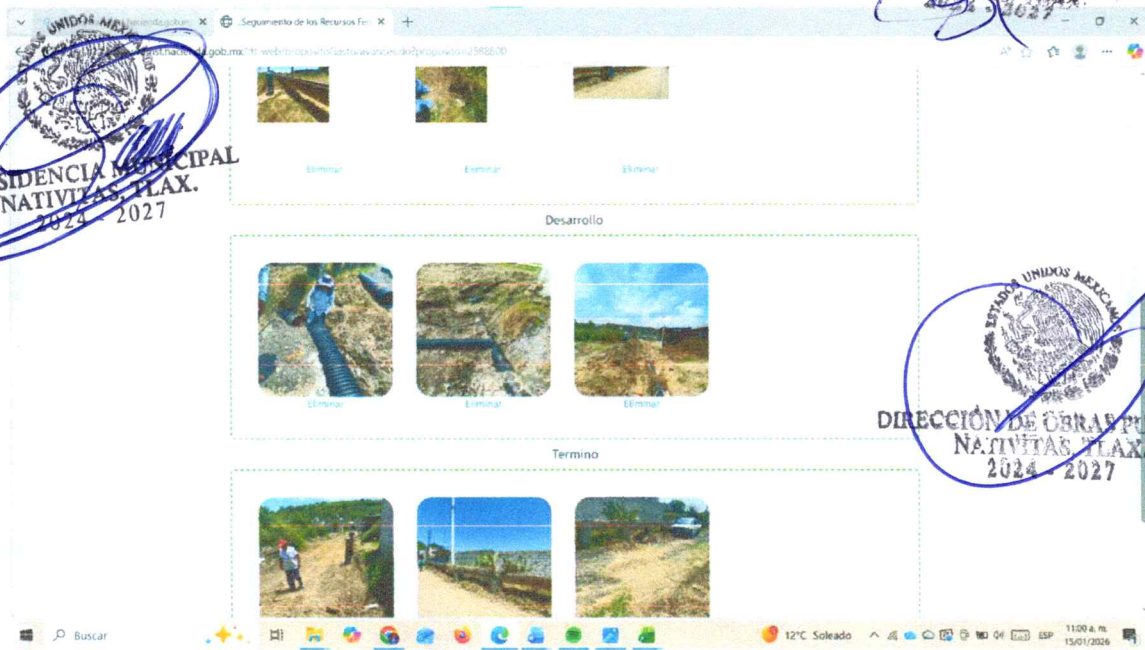


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


001068



FAIS2523036

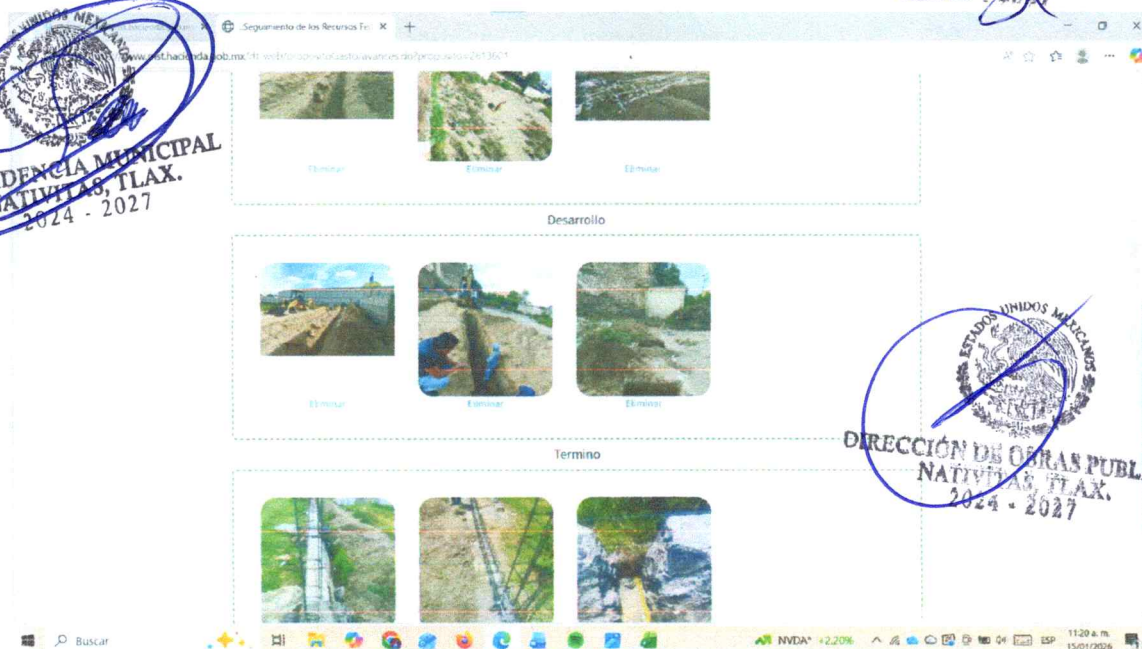

001069




PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001070

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523002 AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523002
NOMBRE: AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA
DESCRIPCIÓN: LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 JUL 2025
FECHA DE LICITACIÓN: 28 JUL 2025
FECHA DE FALLO: 30 JUL 2025
LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA
UBICACIÓN: CALLE GUADALUPE VICTORIA
FECHA DE INICIO: 01 OCT 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2025


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523002.
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 OCT 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ISRAEL TESIS TZOMPANZI
DOMICILIO: FRESNO SUR
No. Exterior: 7043 No. Interior:
Colonia: NO TIENE C. P.: 72520
Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA
TELÉFONO: 2464618109
R. F. C.: TETI871022V54
CONTACTO: N/A

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,251,359.23
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001071

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523002 AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	1,251,359.23
TOTAL ASIGNADO.....		1,251,359.23

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
I	PRELIMINARES	3.910	46,984.45	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		46,984.45	0.00		
II	TERRACERIAS	25.310	303,695.35	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		303,695.35	0.00		
III	ALBAÑILERIA	25.010	300,095.37	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		300,095.37	0.00		
IV	OBRAS COMPLEMENTARIAS	45.770	600,584.06	40,080.00	6.674	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		600,584.06	40,080.00		
TOTAL		100.000	1,251,359.23	40,080.00	3.203	45.770

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	45.770	54.230	100.000
FINANCIERO:	40,080.00 3.203	1,211,279.23 96.797	1,251,359.23 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001072

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523002 AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		1,211,279.23	0.00	1,211,279.23
29 DIC 2025 D12FS10011	1.2.3.5.4.2		46,984.45	1,164,294.78
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523002 A NO CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
29 DIC 2025 D12FS10011	1.2.3.5.4.2		303,695.35	860,599.43
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523002 A NO CAPITALIZABLE			
Concepto:	II			
	TERRACERIAS			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
29 DIC 2025 D12FS10011	1.2.3.5.4.2		300,095.37	560,504.06
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523002 A NO CAPITALIZABLE			
Concepto:	III			
	ALBAÑILERIA			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
29 DIC 2025 D12FS10011	1.2.3.5.4.2		600,584.06	-40,080.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523002 A NO CAPITALIZABLE			
Concepto:	IV			
	OBRAS COMPLEMENTARIAS			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
29 DIC 2025 E12FS10015	1.2.3.5.4.2	40,080.00		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS 2025 FAIS2523002 ESTIMACION 3 FINIQUITO AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA			
Requisición:	12FS100015			

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001073

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523002 AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA

Concepto: IV
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Fuente financ.: 5.01
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
Unidad admin.: 006
OBRAS PÚBLICAS
Programa: 018
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA,
CULTURAL Y DEPORTIVA
Componente: 03
FOMENTAR EL DEPORTE
Actividad: 02
DAR MANTENIMIENTO DE MANERA CONTINUA
LOS EPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.
Función: 256
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES INHERENTES
C.O.G.: 6.1.4.2
CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.
Ficha por pagar: FAIS2523002
Acreedor: 0006921
ISRAEL TEXIS TZOMPANZI
Contrato: FAIS2523002.

SUMA PERIODO:.....	40,080.00	1,251,359.23	-1,211,279.23
SALDO FINAL:.....	1,251,359.23	1,251,359.23	0.00

=====



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001074

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523004

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
DESCRIPCIÓN: CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE
PROGRESO DE LA LOC DE JESUS TEPACTEPEC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 SEP 2025
FECHA DE LICITACIÓN: 06 OCT 2025
FECHA DE FALLO: 08 OCT 2025

LOCALIDAD: JESUS TEPACTEPEC
UBICACIÓN: CALLE PROGRESO
FECHA DE INICIO: 10 OCT 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523004
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 OCT 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: OSVALDO SAMPEDRO JUAREZ
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad:

TELÉFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,285,898.45
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001075

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	1,285,898.45
TOTAL ASIGNADO.....		1,285,898.45



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
I	PRELIMINARES	20.140	258,957.85	258,957.85 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		258,957.85	258,957.85
II	TERRACERIAS	22.370	287,699.60	287,699.60 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		287,699.60	287,699.60
III	PAVIMENTO	50.190	645,360.75	645,360.75 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		645,360.75	645,360.75
IV	DRENAJE SANITARIO	4.890	62,836.25	62,836.25 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		62,836.25	62,836.25
V	AGUA POTABLE	0.440	5,661.33	5,661.33 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		5,661.33	5,661.33
VI	TRABAJOS FINALES	1.970	25,382.67	25,382.67 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		25,382.67	25,382.67
TOTAL		100.000	1,285,898.45	1,285,898.45 100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,285,898.45 100.000	0.00 0.000	1,285,898.45 100.000


COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 DIC 2025: SE COMPLETÓ LA OBRA AL 100%



OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
08 DIC 2025 E12FS10004	1.2.3.5.5.2	258,957.85		258,957.85
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	2025 FAIS2523004 ESTIMACION 1 CONSTRUCCI			
	ON DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE			
	PROGRESO DE LA LOC DE JESUS TEPACTEPEC			
Requisición:	12FS100004			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	01			
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE			
	DIFERENTES CAMINOS			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.5.2			
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
Ficha por pagar:	FAIS2523004.			
Acreedor:	0006156			
	OSVALDO SAMPEDRO JUAREZ			
Contrato:	FAIS2523004			
29 DIC 2025 D12FS10004	1.2.3.5.5.2		258,957.85	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COM			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523004			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.5.2			
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
08 DIC 2025 E12FS10004	1.2.3.5.5.2	287,699.60		287,699.60
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	2025 FAIS2523004 ESTIMACION 1 CONSTRUGCI			
	ON DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE			
	PROGRESO DE LA LOC DE JESUS TEPACTEPEC			
Requisición:	12FS100004			
Concepto:	II			
	TERRACERIAS			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			



001077

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN				
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	01			
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.5.2			
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
Ficha por pagar:	FAIS2523004.			
Acreeedor:	0006156			
	OSVALDO SAMPEDRO JUAREZ			
Contrato:	FAIS2523004			
29 DIC 2025 D12FS10004	1.2.3.5.5.2	287,699.60		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523004 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	II			
	TERRACERIAS			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.5.2			
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
08 DIC 2025 E12FS10004	1.2.3.5.5.2	42,096.94		42,096.94
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	2025 FAIS2523004 ESTIMACION 1 CONSTRUCCI			
	ON DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE			
	PROGRESO DE LA LOC DE JESUS TEPACTEP			
Requisición:	12FS100004			
Concepto:	III			
	PAVIMENTO			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	01			
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE			
	DIFERENTES CAMINOS			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.5.2			
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
Ficha por pagar:	FAIS2523004.			
Acreeedor:	0006156			
	OSVALDO SAMPEDRO JUAREZ			
Contrato:	FAIS2523004			
29 DIC 2025 D12FS10004	1.2.3.5.5.2	645,360.75		-603,263.81
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523004 A NO			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027
SINDICATO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001078


OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN			
	CAPITALIZABLE		
Concepto:	III		
	PAVIMENTO		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
29 DIC 2025 E12FS10005	1.2.3.5.5.2	603,263.81	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	2025 FAIS2523004 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE		
	PROGRESO DE LA LOC DE JESUS TEPACTEPEC		
Requisición:	12FS100005		
Concepto:	III		
	PAVIMENTO		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	01		
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE		
	DIFERENTES CAMINOS		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523004.		
Acreeedor:	0006156		
	OSVALDO SAMPEDRO JUAREZ		
Contrato:	FAIS2523004		
29 DIC 2025 D12FS10004	1.2.3.5.5.2	62,836.25	-62,836.25
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523004 A NO		
	CAPITALIZABLE		
Concepto:	IV		
	DRENAJE SANITARIO		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
29 DIC 2025 E12FS10005	1.2.3.5.5.2	62,836.25	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	2025 FAIS2523004 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE		
	PROGRESO DE LA LOC DE JESUS TEPACTEPEC		
Requisición:	12FS100005		
Concepto:	IV		
	DRENAJE SANITARIO		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001079

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	01		
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE		
	DIFERENTES CAMINOS		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523004.		
Acreedor:	0006156		
	OSVALDO SAMPEDRO JUAREZ		
Contrato:	FAIS2523004		
29 DIC 2025 D12FS10004	1.2.3.5.5.2	5,661.33	-5,661.33
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523004 A NO		
	CAPITALIZABLE		
Concepto:	V		
	AGUA POTABLE		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
29 DIC 2025 E12FS10005	1.2.3.5.5.2	5,661.33	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	2025 FAIS2523004 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE		
	PROGRESO DE LA LOC DE JESUS TEPACTEPEC		
Requisición:	12FS100005		
Concepto:	V		
	AGUA POTABLE		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	01		
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE		
	DIFERENTES CAMINOS		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523004.		
Acreedor:	0006156		
	OSVALDO SAMPEDRO JUAREZ		
Contrato:	FAIS2523004		



OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN				
29 DIC 2025	D12FS10004	1.2.3.5.5.2	25,382.67	-25,382.67
		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523004 A NO		
		CAPITALIZABLE		
	Concepto:	VI		
		TRABAJOS FINALES		
	Fuente financ.:	5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.2		
		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
29 DIC 2025	E12FS10005	1.2.3.5.5.2	25,382.67	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		2025 FAIS2523004 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
		CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE		
		PROGRESO DE LA LOC DE JESUS TEPACTEPEC		
	Requisición:	12FS100005		
	Concepto:	VI		
		TRABAJOS FINALES		
	Fuente financ.:	5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
	Componente:	02		
		POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
		DE URBANIZACIÓN		
	Actividad:	01		
		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE		
		DIFERENTES CAMINOS		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.5.2		
		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	Ficha por pagar:	FAIS2523004.		
	Acreedor:	0006156		
		OSVALDO SAMPEDRO JUAREZ		
	Contrato:	FAIS2523004		
SUMA PERIODO:.....			1,285,898.45	1,285,898.45
SALDO FINAL:.....			1,285,898.45	1,285,898.45
=====				



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001081

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523005 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523005
NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
DE BAJA TENSION
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SAN BERNABE CAPULA
UBICACIÓN: CALLE MORELOS
FECHA DE INICIO: 10 NOV 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 NOV 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523005
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO

No. Exterior: 6 No. Interior:
Colonia: 1RA SECCION SAN JOSE TEACALCO C. P.: 90495
Municipio: SAN JOSE TEACALCO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2441129317
R. F. C.: HEGF850514TP3
CONTACTO: N/A

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$356,173.78
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001082

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523005 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	356,173.78
TOTAL ASIGNADO.....		356,173.78



RESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX
2024 - 2027

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
I	PRELIMINARES	3.210	11,437.65	11,437.65	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		11,437.65	11,437.65		
II	POSTES	40.240	143,310.80	143,310.80	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		143,310.80	143,310.80		
III	TENDIDO DE LINEAS	32.150	114,507.85	114,507.85	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		114,507.85	114,507.85		
IV	TRANSFORMADOR	24.400	86,917.48	86,917.48	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		86,917.48	86,917.48		
TOTAL		100.000	356,173.78	356,173.78	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	356,173.78 100.000	0.00 0.000	356,173.78 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%



TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX
2024 - 2027



SINDICATO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX
2024 - 2027

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001083

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523005 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
29 DIC 2025 D12FS10010	1.2.3.6.3.2		11,437.65	-11,437.65
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523005 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
29 DIC 2025 E12FS10014	1.2.3.6.3.2			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523005 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			
	DE BAJA TENSION EN SAN BERNABE CAPULA			
Requisición:	12FS100014			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
Ficha por pagar:	FAIS2523005.			
Acreedor:	0006917			
	FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Contrato:	FAIS2523005			
29 DIC 2025 D12FS10010	1.2.3.6.3.2		143,310.80	-143,310.80
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523005 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	II			
	POSTES			
Fuente financ.:	5.01			

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001084

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523005 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.	
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:	6.2.3.2
29 DIC 2025 E12FS10014	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.
	1.2.3.6.3.2
	143,310.80
	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,	
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
2025 FAIS2523005 ESTIMACION 1 FINIQUITO	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	
DE BAJA TENSION EN SAN BERNABE CAPULA	
Requisición:	12FS100014
Concepto:	II
Fuente financ.:	POSTES
	5.01
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
Unidad admin.:	006
Programa:	OBRAS PÚBLICAS
	024
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
	DESARROLLO URBANO
Componente:	02
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS
	DE URBANIZACIÓN
Actividad:	02
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS
	COMUNIDADES.
Función:	221
	URBANIZACIÓN
C.O.G.:	6.2.3.2
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.
Ficha por pagar:	FAIS2523005.
Acreeedor:	0006917
	FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
Contrato:	FAIS2523005
29 DIC 2025 D12FS10010	1.2.3.6.3.2
	114,507.85
	-114,507.85
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,	
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523005 A NO	
CAPITALIZABLE	
Concepto:	III
	TENDIDO DE LINEAS
Fuente financ.:	5.01
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
C.O.G.:	6.2.3.2
29 DIC 2025 E12FS10014	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.
	1.2.3.6.3.2
	114,507.85
	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,	
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
2025 FAIS2523005 ESTIMACION 1 FINIQUITO	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	
DE BAJA TENSION EN SAN BERNABE CAPULA	
Requisición:	12FS100014
Concepto:	III
	TENDIDO DE LINEAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX
2024 - 2027



TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX
2024 - 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX
2024 - 2027

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001085

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523005 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02 AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS COMUNIDADES.		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
Ficha por pagar:	FAIS2523005.		
Acreedor:	0006917 FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ		
Contrato:	FAIS2523005		
29 DIC 2025 D12FS10010	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523005 A NO CAPITALIZABLE	86,917.48	-86,917.48
Concepto:	IV TRANSFORMADOR		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
29 DIC 2025 E12FS10014	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 2025 FAIS2523005 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN SAN BERNABE CAPULA	86,917.48	0.00
Requisición:	12FS100014		
Concepto:	IV TRANSFORMADOR		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02 AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS		



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001086

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523005 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

Función: COMUNIDADES.
221
URBANIZACIÓN
C.O.G.: 6.2.3.2
CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.
Ficha por pagar: FAIS2523005.
Acreedor: 0006917
FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
Contrato: FAIS2523005

SUMA PERIODO:.....	356,173.78	356,173.78	0.00
SALDO FINAL:.....	356,173.78	356,173.78	0.00

=====



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001087

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523007 AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523007

NOMBRE: AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE
DE LA LOC DE SAN FRANCISCO TENEXYECAC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO TENEXYECAC
UBICACIÓN: CALLE BARRANCA
FECHA DE INICIO: 01 NOV 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523007
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 NOV 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: POZOS NANACAMILPA ELECTROMECHANICA TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCION
DOMICILIO: LERDO
No. Exterior: 509 No. Interior:
Colonia: FRANCISCO VILLA C. P.: 90710
Municipio: NANACAMILPA Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO: 5547143249
R. F. C.: PNE240119AU0
CONTACTO: MIGUEL ANGEL ROLDAN OLMEDO

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$648,482.61
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001088

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523007 AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	648,482.61
TOTAL ASIGNADO.....		648,482.61

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
I	PRELIMINARES	29.280	190,027.72	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		190,027.72	0.00		
II	EQUIPO DE BOMBEO Y ANALISIS DE LABORATOR	29.440	191,017.26	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		191,017.26	0.00		
III	EQUIPO ELECTRICO	13.920	90,361.20	24,780.10	27.423	27.443
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		90,361.20	24,780.10		
IV	INSTALACIONES ESPECIALES	11.000	71,322.03	71,322.03	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		71,322.03	71,322.03		
V	EQUIPO DE CLORACION	7.860	50,983.64	50,983.64	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		50,983.64	50,983.64		
VI	TRABAJOS FINALES	8.500	54,770.76	54,770.76	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		54,770.76	54,770.76		
TOTAL		100.000	648,482.61	201,856.53	31.128	31.180

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	31.180	68.820	100.000
FINANCIERO:	201,856.53 31.128	446,626.08 68.873	648,482.61 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001089

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523007 AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		446,626.08	0.00	446,626.08
31 DIC 2025 D12FS10022	1.2.3.6.3.2		190,027.72	256,598.36
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523007 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
31 DIC 2025 D12FS10022	1.2.3.6.3.2		191,017.26	65,581.10
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523007 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	II			
	EQUIPO DE BOMBEO Y ANALISIS DE LABORATOR			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
31 DIC 2025 D12FS10022	1.2.3.6.3.2			-24,780.10
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523007 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	III			
	EQUIPO ELECTRICO			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
31 DIC 2025 E12FS10026	1.2.3.6.3.2	24,780.10		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523007 ESTIMACION 2 FINIQUITO			
	AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE			
	DE LA LOC DE SAN FRANCISCO TENEXTEPEC			
Requisición:	12FS100026			
Concepto:	III			
	EQUIPO ELECTRICO			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001090

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523007 AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO

Componente: 02
POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS
DE URBANIZACIÓN

Actividad: 03
REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON
EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.

Función: 221
URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.2.3.2
CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.

Ficha por pagar: FAIS2523007.
Acreeedor: 0007681
POZOS NANACAMILPA ELECTROMECHANICA
TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCION

Contrato: FAIS2523007
31 DIC 2025 D12FS10022 1.2.3.6.3.2 71,322.03 -71,322.03
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523007 A NO
CAPITALIZABLE

Concepto: IV
INSTALACIONES ESPECIALES

Fuente financ.: 5.01
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

C.O.G.: 6.2.3.2
CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.
31 DIC 2025 E12FS10026 1.2.3.6.3.2 71,322.03 0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
2025 FAIS2523007 ESTIMACION 2 FINIQUITO
AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE
DE LA LOC DE SAN FRANCISCO TENEXYECAC
12FS100026

Requisición: 12FS100026
Concepto: IV
INSTALACIONES ESPECIALES

Fuente financ.: 5.01
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Unidad admin.: 006
OBRAS PÚBLICAS

Programa: 024
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO

Componente: 02
POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS
DE URBANIZACIÓN

Actividad: 03
REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON
EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.

Función: 221
URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.2.3.2
CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.

Ficha por pagar: FAIS2523007.
Acreeedor: 0007681



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001091

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523007 AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE		
	POZOS NANACAMILPA ELECTROMECANICA TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCION	
Contrato:	FAIS2523007	
31 DIC 2025 D12FS10022	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523007 A NO CAPITALIZABLE	50,983.64 -50,983.64
Concepto:	V EQUIPO DE CLORACION	
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.	
31 DIC 2025 E12FS10026	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 2025 FAIS2523007 ESTIMACION 2 FINIQUITO AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE SAN FRANCISCO TENEXYECAC	50,983.64 0.00
Requisición:	12FS100026	
Concepto:	V EQUIPO DE CLORACION	
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS	
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN	
Actividad:	03 REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.	
Función:	221 URBANIZACIÓN	
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.	
Ficha por pagar:	FAIS2523007.	
Acreedor:	0007681 POZOS NANACAMILPA ELECTROMECANICA TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCION	
Contrato:	FAIS2523007	
31 DIC 2025 D12FS10022	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523007 A NO CAPITALIZABLE	54,770.76 -54,770.76
Concepto:	VI TRABAJOS FINALES	
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001092

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523007 AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE

C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
31 DIC 2025	E12FS10026	1.2.3.6.3.2	54,770.76	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523007 ESTIMACION 2 FINIQUITO			
	AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE			
	DE LA LOC DE SAN FRANCISCO TENEXYECAC			
Requisición:	12FS100026			
Concepto:	VI			
	TRABAJOS FINALES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	03			
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON			
	EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
Ficha por pagar:	FAIS2523007.			
Acreedor:	0007681			
	POZOS NANACAMILPA ELECTROMECANICA			
	TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCION			
Contrato:	FAIS2523007			
SUMA PERIODO:.....		201,856.53	648,482.61	-446,626.08
SALDO FINAL:.....		648,482.61	648,482.61	0.00
=====				



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001093

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523009 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523009

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
EN BAJA TENSION EN C. REFORMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO TENEXYECAC
UBICACIÓN: CALLE REFORMA
FECHA DE INICIO: 15 DIC 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523009
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO

No. Exterior: 6 No. Interior:
Colonia: 1RA SECCION SAN JOSE TEACALCO C. P.: 90495
Municipio: SAN JOSE TEACALCO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2441129317
R. F. C.: HEGF850514TP3
CONTACTO: N/A

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$128,281.41

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001094

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523009 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	128,281.41
TOTAL ASIGNADO.....		128,281.41

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
I	PRELIMINARES	4.300	5,520.25	5,520.25 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		5,520.25	5,520.25
II	POSTES	54.910	70,433.77	70,433.77 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		70,433.77	70,433.77
III	TENDIDO DE LINEAS	40.790	52,327.39	52,327.39 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		52,327.39	52,327.39
TOTAL		100.000	128,281.41	128,281.41 100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	128,281.41 100.000	0.00 0.000	128,281.41 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001095

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523009 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
29 DIC 2025 D12FS10015	1.2.3.6.3.2		5,520.25	-5,520.25
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523009 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
29 DIC 2025 E12FS10019	1.2.3.6.3.2	5,520.25		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523009 AMPLIACION DE RED DE			
	ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN C.			
	REFORMA EN LOC. SAN FRANCISCO TENEXYETAC			
Requisición:	12FS100019			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
Ficha por pagar:	FAIS2523009.			
Acreedor:	0006917			
	FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Contrato:	FAIS2523009			
29 DIC 2025 D12FS10015	1.2.3.6.3.2		70,433.77	-70,433.77
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523009 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	II			
	POSTES			
Fuente financ.:	5.01			

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001096

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523009 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.3.2		
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
29 DIC 2025 E12FS10019	1.2.3.6.3.2	70,433.77	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 2025 FAIS2523009 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN C. REFORMA EN LOC. SAN FRANCISCO TENEXYECAC 12FS100019		
Requisición:	12FS100019		
Concepto:	II POSTES		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02 AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS COMUNIDADES.		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
Ficha por pagar:	FAIS2523009.		
Acreedor:	0006917 FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ		
Contrato:	FAIS2523009		
29 DIC 2025 D12FS10015	1.2.3.6.3.2	52,327.39	-52,327.39
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523009 A NO CAPITALIZABLE		
Concepto:	III TENDIDO DE LINEAS		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
29 DIC 2025 E12FS10019	1.2.3.6.3.2	52,327.39	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 2025 FAIS2523009 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN C. REFORMA EN LOC. SAN FRANCISCO TENEXYECAC 12FS100019		
Requisición:	12FS100019		
Concepto:	III TENDIDO DE LINEAS		

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001097

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523009 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

Fuente financ.: 5.01
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Unidad admin.: 006
OBRAS PÚBLICAS

Programa: 024
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO

Componente: 02
POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS
DE URBANIZACIÓN

Actividad: 02
AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS
COMUNIDADES.

Función: 221
URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.2.3.2
CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.

Ficha por pagar: FAIS2523009.

Acreedor: 0006917
FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ

Contrato: FAIS2523009

SUMA PERIODO:.....	128,281.41	128,281.41	0.00
SALDO FINAL:.....	128,281.41	128,281.41	0.00

=====



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001093

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523010 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523010

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE
LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOYATENCO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 OCT 2025
FECHA DE LICITACIÓN: 27 OCT 2025
FECHA DE FALLO: 29 OCT 2025

LOCALIDAD: SAN JOSE ATOYATENCO
UBICACIÓN: CARRETERA VILLA ALTA-TC PUEBLA-TLAXCALA
FECHA DE INICIO: 27 NOV 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523010
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 15 NOV 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO

No. Exterior: 8 No. Interior:

Colonia: GALEOTITLA SN BERNARDINO TLAXCALANCINGO CMTS.MS2820

Municipio: SAN ANDRES CHOLULA Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO: 222 284 0214

R. F. C.: LOER870310QTA

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,910,415.51

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:


CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001099

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523010 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	1,910,415.51
TOTAL ASIGNADO.....		1,910,415.51


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
I	PRELIMINARES	1.340	25,618.23	25,618.23	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		25,618.23	25,618.23		
II	CIMENTACION	21.500	410,661.07	410,661.07	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		410,661.07	410,661.07		
III	ESTRUCTURA METALICA	67.380	1,287,256.51	1,287,256.51	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,287,256.51	1,287,256.51		
IV	BAJADAS PLUVIALES	4.040	77,164.57	77,164.57	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		77,164.57	77,164.57		
V	INSTALACION ELECTRICA	5.200	99,480.58	99,480.58	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		99,480.58	99,480.58		
VI	TRABAJOS FINALES	0.540	10,234.55	10,234.55	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		10,234.55	10,234.55		
TOTAL		100.000	1,910,415.51	1,910,415.51	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,910,415.51 100.000	0.00 0.000	1,910,415.51 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001100

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523010 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
19 DIC 2025 E12FS10010	1.2.3.5.9.3	25,618.23		25,618.23
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
	2025 FAIS2523010 ESTIMACION 1 CONST DE			
	TECHADO EN EXPLANADA DE LA LOCALIDAD			
	DE SAN JOSE ATOYATENCO			
Requisición:	12FS100010			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	03			
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON			
	EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.9.3			
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
Ficha por pagar:	FAIS2523010			
Acreedor:	0003378			
	JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS			
Contrato:	FAIS2523010			
29 DIC 2025 D12FS10007	1.2.3.5.9.3		25,618.23	0.00
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523010 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.9.3			
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
19 DIC 2025 E12FS10010	1.2.3.5.9.3	410,661.07		410,661.07
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
	2025 FAIS2523010 ESTIMACION 1 CONST DE			
	TECHADO EN EXPLANADA DE LA LOCALIDAD			
	DE SAN JOSE ATOYATENCO			
Requisición:	12FS100010			
Concepto:	II			
	CIMENTACION			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			

001101

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523010 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02		
POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	03		
REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.			
Función:	221		
URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.9.3		
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
Ficha por pagar:	FAIS2523010		
Acreeedor:	0003378		
JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS			
Contrato:	FAIS2523010		
29 DIC 2025	D12FS10007	410,661.07	0.00
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523010 A NO CAPITALIZABLE			
Concepto:	II		
CIMENTACION			
Fuente financ.:	5.01		
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.9.3		
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
19 DIC 2025	E12FS10010	1,007,998.03	1,007,998.03
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
2025 FAIS2523010 ESTIMACION 1 CONST DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOYATENCO			
Requisición:	12FS100010		
Concepto:	III		
ESTRUCTURA METALICA			
Fuente financ.:	5.01		
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006		
OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024		
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02		
POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	03		
REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.			
Función:	221		
URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.9.3		
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
Ficha por pagar:	FAIS2523010		
Acreeedor:	0003378		
JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS			
Contrato:	FAIS2523010		
29 DIC 2025	D12FS10007	1,287,256.51	-279,258.48
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523010 A NO			

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001102

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523010 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA				
		CAPITALIZABLE		
Concepto:		III		
		ESTRUCTURA METALICA		
Fuente financ.:		5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.1.9.3		
		OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
29 DIC 2025 E12FS10011		1.2.3.5.9.3	279,258.48	0.00
		OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
		2025 FAIS2523010 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE		
		SAN JOSE ATOYATENCO		
Requisición:		12FS100011		
Concepto:		III		
		ESTRUCTURA METALICA		
Fuente financ.:		5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:		02		
		POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
		DE URBANIZACIÓN		
Actividad:		03		
		REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON		
		EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.1.9.3		
		OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
Ficha por pagar:		FAIS2523010		
Acreeedor:		0003378		
		JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS		
Contrato:		FAIS2523010		
29 DIC 2025 D12FS10007		1.2.3.5.9.3	77,164.57	-77,164.57
		OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
		TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523010 A NO		
		CAPITALIZABLE		
Concepto:		IV		
		BAJADAS PLUVIALES		
Fuente financ.:		5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.1.9.3		
		OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
29 DIC 2025 E12FS10011		1.2.3.5.9.3	77,164.57	0.00
		OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
		2025 FAIS2523010 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE		
		SAN JOSE ATOYATENCO		
Requisición:		12FS100011		
Concepto:		IV		
		BAJADAS PLUVIALES		
Fuente financ.:		5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001103

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523010 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA

Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	03		
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON		
	EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.9.3		
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
Ficha por pagar:	FAIS2523010		
Acreedor:	0003378		
	JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS		
Contrato:	FAIS2523010		
29 DIC 2025 D12FS10007	1.2.3.5.9.3	99,480.58	-99,480.58
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523010 A NO		
	CAPITALIZABLE		
Concepto:	V		
	INSTALACION ELECTRICA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.9.3		
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
29 DIC 2025 E12FS10011	1.2.3.5.9.3	99,480.58	0.00
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
	2025 FAIS2523010 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE		
	SAN JOSE ATOYATENCO		
Requisición:	12FS100011		
Concepto:	V		
	INSTALACION ELECTRICA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	03		
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON		
	EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.9.3		
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
Ficha por pagar:	FAIS2523010		
Acreedor:	0003378		
	JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS		
Contrato:	FAIS2523010		

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001104

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523010 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA				
29 DIC 2025	D12FS10007	1.2.3.5.9.3	10,234.55	-10,234.55
		OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
		TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523010 A NO		
		CAPITALIZABLE		
	Concepto:	VI		
		TRABAJOS FINALES		
	Fuente financ.:	5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.9.3		
		OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
29 DIC 2025	E12FS10011	1.2.3.5.9.3	10,234.55	0.00
		OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
		2025 FAIS2523010 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE		
		SAN JOSE ATOYATENCO		
	Requisición:	12FS100011		
	Concepto:	VI		
		TRABAJOS FINALES		
	Fuente financ.:	5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
	Componente:	02		
		POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
		DE URBANIZACIÓN		
	Actividad:	03		
		REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON		
		EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.9.3		
		OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
	Ficha por pagar:	FAIS2523010		
	Acreedor:	0003378		
		JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS		
	Contrato:	FAIS2523010		
SUMA PERIODO:.....			1,910,415.51	1,910,415.51
SALDO FINAL:.....			1,910,415.51	1,910,415.51
=====				



TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



SINDICATO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001105

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523011 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523011

NOMBRE: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN
EN C PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE ANALCO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 NOV 2025
FECHA DE LICITACIÓN: 05 DIC 2025
FECHA DE FALLO: 08 DIC 2025

LOCALIDAD: SAN MIGUEL ANALCO
UBICACIÓN: CALLE PROGRESO
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523011
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 15 NOV 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIO MORALES SILVA

DOMICILIO: CANAL SAN IGNACIO

No. Exterior: 7 No. Interior:

Colonia: SAN MIGUEL XOCHITECATITLA C. P.: 9071

Municipio: NATIVITAS Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO: 24663108430

R. F. C.: MOSM880118576

CONTACTO: MUNICIPIO

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,971,063.91

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001106

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523011 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	1,971,063.91
TOTAL ASIGNADO.....		1,971,063.91

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
I	PRELIMINARES	1.930	38,048.79	38,048.79	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		38,048.79	38,048.79		
II	TERRACERIAS	15.980	315,058.74	315,058.74	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		315,058.74	315,058.74		
III	PAVIMENTO	47.740	941,010.24	941,010.24	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		941,010.24	941,010.24		
IV	DRENAJE SANITARIO	19.420	382,810.89	382,810.89	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		382,810.89	382,810.89		
V	AGUA POTABLE	7.720	152,164.43	152,164.43	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		152,164.43	152,164.43		
VI	TRABAJOS FINALES	6.850	134,934.36	134,934.36	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		134,934.36	134,934.36		
VII	EXTRAORDINARIOS	0.360	7,036.46	7,036.46	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		7,036.46	7,036.46		
TOTAL		100.000	1,971,063.91	1,971,063.91	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	
FINANCIERO:	1,971,063.91 100.000	0.00 0.000	1,971,063.91 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2025: SE CONCLUYE LO OBRA AL 100%

PRESIDENTE MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001107

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523011 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2025 D12FS10019	1.2.3.5.5.3		38,048.79	-38,048.79
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523011 A NO CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.5.3			
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
30 DIC 2025 E12FS10023	1.2.3.5.5.3			0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	2025 FAIS2523011 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN C PROGRESO DE LA LOC DE ANALCO			
Requisición:	12FS100023			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	03			
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.5.3			
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
Ficha por pagar:	FAIS2523011			
Acreedor:	MNT0106			
	MARIO MORALES SILVA			
Contrato:	FAIS2523011			
30 DIC 2025 D12FS10019	1.2.3.5.5.3		315,058.74	-315,058.74
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523011 A NO CAPITALIZABLE			
Concepto:	II			
	TERRACERIAS			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.5.3			
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001108

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523011 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN				
30 DIC 2025	E12FS10023	1.2.3.5.5.3	315,058.74	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		2025 FAIS2523011 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN C PROGRESO DE LA LOC DE ANALCO		
	Requisición:	12FS100023		
	Concepto:	II		
		TERRACERIAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	02		
		POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	Actividad:	03		
		REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
	Ficha por pagar:	FAIS2523011		
	Acreedor:	MNT0106		
		MARIO MORALES SILVA		
	Contrato:	FAIS2523011		
30 DIC 2025	D12FS10019	1.2.3.5.5.3	-941,010.24	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523011 A NO CAPITALIZABLE		
	Concepto:	III		
		PAVIMENTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
30 DIC 2025	E12FS10023	1.2.3.5.5.3	941,010.24	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		2025 FAIS2523011 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN C PROGRESO DE LA LOC DE ANALCO		
	Requisición:	12FS100023		
	Concepto:	III		
		PAVIMENTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		



001109

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523011 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN				
Componente:	02	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	03	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.3	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523011			
Acreeedor:	MNT0106	MARIO MORALES SILVA		
Contrato:	FAIS2523011			
30 DIC 2025	D12FS10019	1.2.3.5.5.3	382,810.89	-382,810.89
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523011 A NO CAPITALIZABLE		
Concepto:	IV	DRENAJE SANITARIO		
Fuente financ.:	5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
30 DIC 2025	E12FS10023	1.2.3.5.5.3	382,810.89	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		2025 FAIS2523011 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN C PROGRESO DE LA LOC DE ANALCO		
Requisición:	12FS100023			
Concepto:	IV	DRENAJE SANITARIO		
Fuente financ.:	5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	03	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.3	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523011			
Acreeedor:	MNT0106	MARIO MORALES SILVA		
Contrato:	FAIS2523011			
30 DIC 2025	D12FS10019	1.2.3.5.5.3	152,164.43	-152,164.43
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		

071110

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523011 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523011 A NO CAPITALIZABLE		
Concepto:	V		
	AGUA POTABLE		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
30 DIC 2025 E12FS10023	1.2.3.5.5.3		0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	2025 FAIS2523011 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN C PROGRESO DE LA LOC DE ANALCO		
Requisición:	12FS100023		
Concepto:	V		
	AGUA POTABLE		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	03		
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523011		
Acreedor:	MNT0106		
	MARIO MORALES SILVA		
Contrato:	FAIS2523011		
30 DIC 2025 D12FS10019	1.2.3.5.5.3	134,934.36	-134,934.36
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523011 A NO CAPITALIZABLE		
Concepto:	VI		
	TRABAJOS FINALES		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
30 DIC 2025 E12FS10023	1.2.3.5.5.3	134,934.36	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	2025 FAIS2523011 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN C PROGRESO DE LA LOC DE ANALCO		
Requisición:	12FS100023		
Concepto:	VI		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



SECRETARÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



SINDICATO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001111

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523011 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN

Fuente financ.:	TRABAJOS FINALES 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	03 REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.3 AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523011		
Acreedor:	MNT0106 MARIO MORALES SILVA		
Contrato:	FAIS2523011		
30 DIC 2025 D12FS10019	1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523011 A NO CAPITALIZABLE	7,036.46	-7,036.46
Concepto:	VII EXTRAORDINARIOS		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3 AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
30 DIC 2025 E12FS10023	1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2025 FAIS2523011 ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN C PROGRESO DE LA LOC DE ANALCO	7,036.46	0.00
Requisición:	12FS100023		
Concepto:	VII EXTRAORDINARIOS		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	03 REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221 URBANIZACIÓN		

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001112

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523011 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN

C.O.G.: 6.1.5.3
AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN
Ficha por pagar: FAIS2523011
Acreedor: MNT0106
MARIO MORALES SILVA
Contrato: FAIS2523011

SUMA PERIODO:.....	1,971,063.91	1,971,063.91	0.00
SALDO FINAL:.....	1,971,063.91	1,971,063.91	0.00
=====			



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001113

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523012 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523012
NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
EN CALLE CUAUHEMOC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SAN MIGUEL ANALCO
UBICACIÓN: CALLE CUAUHEMOC
FECHA DE INICIO: 11 DIC 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523012
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO

No. Exterior: 6 No. Interior:
Colonia: 1RA SECCION SAN JOSE TEACALCO C. P.: 90495
Municipio: SAN JOSE TEACALCO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2441129317
R. F. C.: HEGF850514TP3
CONTACTO: N/A

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$88,296.65
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



SINDICATO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001114

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523012 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	88,296.65
TOTAL ASIGNADO.....		88,296.65

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
I	TRABAJOS PRELIMINARES	36.330	32,080.60	32,080.60	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		32,080.60	32,080.60		
III	TRABAJOS DE LINEAS AEREAS	63.670	56,216.05	56,216.05	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		56,216.05	56,216.05		
TOTAL		100.000	88,296.65	88,296.65	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	
FINANCIERO:	88,296.65 100.000	0.00 0.000	88,296.65 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE


001115

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523012 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
29 DIC 2025 D12FS10013	1.2.3.6.3.2		32,080.60	-32,080.60
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523012 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	TRABAJOS PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
29 DIC 2025 E12FS10017	1.2.3.6.3.2	32,080.60		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2052 FAIS2523012 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			
	EN CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOC DE ANALCO			
Requisición:	12FS100017			
Concepto:	I			
	TRABAJOS PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
Ficha por pagar:	FAIS2523012.			
Acreedor:	0006917			
	FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Contrato:	FAIS2523012			
29 DIC 2025 D12FS10013	1.2.3.6.3.2		56,216.05	-56,216.05
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523012 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	III			
	TRABAJOS DE LINEAS AEREAS			
Fuente financ.:	5.01			



TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

001116

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523012 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA				
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
29 DIC 2025 E12FS10017	1.2.3.6.3.2	56,216.05		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2052 FAIS2523012 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			
	EN CALLE CUAUHEMOC EN LA LOC DE ANALCO			
Requisición:	12FS100017			
Concepto:	III			
	TRABAJOS DE LINEAS AEREAS			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
Ficha por pagar:	FAIS2523012.			
Acreedor:	0006917			
	FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Contrato:	FAIS2523012			
SUMA PERIODO:		88,296.65	88,296.65	0.00
SALDO FINAL:		88,296.65	88,296.65	0.00
=====				





MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001117

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523014 REHABILITACION DE ESCALINATA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523014

NOMBRE: REHABILITACION DE ESCALINATA
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE ESCALINATA EN PLAZA PUBLICA DE LA LOC DE SAN MIGUEL DE MILAGRO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 OCT 2025
FECHA DE LICITACIÓN: 27 OCT 2025
FECHA DE FALLO: 29 OCT 2025

LOCALIDAD: SAN MIGUEL DEL MILAGRO
UBICACIÓN: CALLE CIRCUITO PERIMETRAL
FECHA DE INICIO: 01 NOV 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523014
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 NOV 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CORPORACION HAE Y ABASTECEDORA S.A DE C.V
DOMICILIO: MORELOS PONIENTE
No. Exterior: 95 No. Interior:
Colonia: LOS PINOS C. P.: 90802
Municipio: CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2461349174
R. F. C.: CHA180322NL1
CONTACTO: JUDITH AGUILA RODRIGUEZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,537,498.64
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001118

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523014 REHABILITACION DE ESCALINATA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	1,537,498.64
TOTAL ASIGNADO.....		1,537,498.64

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
I	PRELIMINARES	1.940	29,908.73	29,908.73	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		29,908.73	29,908.73		
II	CIMENTACION	21.490	330,337.38	330,337.38	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		330,337.38	330,337.38		
III	ELEMENTOS ESTRUCTURALES	55.730	856,837.13	856,837.13	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		856,837.13	856,837.13		
IV	INSTALACION ELECTRICA	0.380	5,766.84	5,766.84	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		5,766.84	5,766.84		
V	EXTRAORDINARIOS	20.460	314,648.56	314,648.56	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		314,648.56	314,648.56		
TOTAL		100.000	1,537,498.64	1,537,498.64	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,537,498.64 100.000	0.00 0.000	1,537,498.64 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

26 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001119

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523014 REHABILITACION DE ESCALINATA
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
26 DIC 2025 D12FS10012	1.2.3.6.9.3		29,908.73	-29,908.73
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523014 A NO			
	CAPITABILIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.9.3			
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
26 DIC 2025 E12FS10016	1.2.3.6.9.3	29,908.73		0.00
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
	2025 FAIS2523014 EST 1 FINIQ REHABILITA			
	CION DE ESCALINATA EN PLAZA PUBLICA DE			
	LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO			
Requisición:	12FS100016			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	018			
	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA,			
	CULTURAL Y DEPORTIVA			
Componente:	03			
	FOMENTAR EL DEPORTE			
Actividad:	02			
	DAR MANTENIMIENTO DE MANERA CONTINUA			
	LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.			
Función:	256			
	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS			
	ACTIVIDADES INHERENTES			
C.O.G.:	6.2.9.3			
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
Ficha por pagar:	FAIS2523014			
Acreedor:	0007731			
	CORPORACION HEE Y ASOCIADOS S. DE C.			
	V			
Contrato:	FAIS2523014			
26 DIC 2025 D12FS10012	1.2.3.6.9.3		330,337.38	-330,337.38
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523014 A NO			
	CAPITABILIZABLE			
Concepto:	II			
	CIMENTACION			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.9.3			
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
26 DIC 2025 E12FS10016	1.2.3.6.9.3	330,337.38		0.00
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001120

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523014 REHABILITACION DE ESCALINATA				
2025 FAIS2523014 EST 1 FINIQ REHABILITACION DE ESCALINATA EN PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO				
Requisición:	12FS100016			
Concepto:	II			
	CIMENTACION			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	018			
	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA			
Componente:	03			
	FOMENTAR EL DEPORTE			
Actividad:	02			
	DAR MANTENIMIENTO DE MANERA CONTINUA LOS EPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.			
Función:	256			
	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES			
C.O.G.:	6.2.9.3			
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
Ficha por pagar:	FAIS2523014.			
Acreeedor:	0007731			
	CORPORACION HAE Y ABASTECEDORA S.A DE C. V			
Contrato:	FAIS2523014			
26 DIC 2025 D12FS10012	1.2.3.6.9.3			
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523014 A NO CAPITABILIZABLE			
Concepto:	III			
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.9.3			
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
26 DIC 2025 E12FS10016	1.2.3.6.9.3	856,837.13		0.00
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
	2025 FAIS2523014 EST 1 FINIQ REHABILITACION DE ESCALINATA EN PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO			
Requisición:	12FS100016			
Concepto:	III			
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	018			
	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA			
Componente:	03			
	FOMENTAR EL DEPORTE			
Actividad:	02			
	DAR MANTENIMIENTO DE MANERA CONTINUA			

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001121

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523014 REHABILITACION DE ESCALINATA

Función: LOS EPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.
256
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES INHERENTES

C.O.G.: 6.2.9.3
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

Ficha por pagar: FAIS2523014.
Acreedor: 0007731
CORPORACION HAE Y ABASTECEDORA S.A DE C.
V

Contrato: FAIS2523014
26 DIC 2025 D12FS10012 1.2.3.6.9.3 5,766.84 -5,766.84
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523014 A NO
CAPITABILIZABLE

Concepto: IV
INSTALACION ELECTRICA

Fuente financ.: 5.01
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

C.O.G.: 6.2.9.3
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

26 DIC 2025 E12FS10016 1.2.3.6.9.3 5,766.84 0.00
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
2025 FAIS2523014 EST 1 FINIQ REHABILITA
CION DE ESCALINATA EN PLAZA PUBLICA DE
LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO

Requisición: 12FS100016
Concepto: IV
INSTALACION ELECTRICA

Fuente financ.: 5.01
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Unidad admin.: 006
OBRAS PÚBLICAS

Programa: 018
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA,
CULTURAL Y DEPORTIVA

Componente: 03
FOMENTAR EL DEPORTE

Actividad: 02
DAR MANTENIMIENTO DE MANERA CONTINUA
LOS EPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Función: 256
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES INHERENTES

C.O.G.: 6.2.9.3
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

Ficha por pagar: FAIS2523014.
Acreedor: 0007731
CORPORACION HAE Y ABASTECEDORA S.A DE C.
V

Contrato: FAIS2523014
26 DIC 2025 D12FS10012 1.2.3.6.9.3 314,648.56 -314,648.56
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523014 A NO
CAPITABILIZABLE

Concepto: V
EXTRAORDINARIOS

Fuente financ.: 5.01



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001122

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523014 REHABILITACION DE ESCALINATA				
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.9.3			
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
26 DIC 2025 E12FS10016	1.2.3.6.9.3	314,648.56		0.00
	OTROS TRABAJOS ESPECILIZADOS			
	2025 FAIS2523014 EST 1 FINIQ REHABILITA			
	CION DE ESCALINATA EN PLAZA PUBLICA DE			
	LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO			
Requisición:	12FS100016			
Concepto:	V			
	EXTRAORDINARIOS			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	018			
	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA,			
	CULTURAL Y DEPORTIVA			
Componente:	03			
	FOMENTAR EL DEPORTE			
Actividad:	02			
	DAR MANTENIMIENTO DE MANERA CONTINUA			
	LOS EPACIOS DEPPORTIVOS Y RECREATIVOS.			
Función:	256			
	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y			
	ACTIVIDADES INHERENTES			
C.O.G.:	6.2.9.3			
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
Ficha por pagar:	FAIS2523014.			
Acreeedor:	0007731			
	CORPORACION HAE Y ABASTECEDORA S.A DE C.			
	V			
Contrato:	FAIS2523014			
SUMA PERIODO:.....	1,537,498.64	1,537,498.64		0.00
SALDO FINAL:.....	1,537,498.64	1,537,498.64		0.00
=====				





MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001123

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523016
NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN
EN C TLAHUICOLE DE LA LOC DE SAN VICENTE
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SAN VICENTE XILOXOCHITLA
UBICACIÓN: CALLE TLAHUICOLE
FECHA DE INICIO: 24 NOV 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523016
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 15 NOV 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AV. REFORMA
No. Exterior: 33 No. Interior:
Colonia: EL ALTO C. P.: 90731
Municipio: SAN DAMIAN TEXOLOX Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 246 46 8 00 98
R. F. C.: GUD080416DZ3
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$623,064.63
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001124

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	623,064.63
TOTAL ASIGNADO.....		623,064.63



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
I	PRELIMINARES	1.130	7,051.47	7,051.47	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		7,051.47	7,051.47		
II	TERRACERIAS	12.730	79,314.29	79,314.29	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		79,314.29	79,314.29		
III	RELLENOS	11.050	68,856.16	68,856.16	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		68,856.16	68,856.16		
IV	PAVIMENTO DE ADOQUIN	32.830	204,583.00	204,583.00	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		204,583.00	204,583.00		
V	ALBAÑILERIA	13.040	81,155.55	81,155.55	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		81,155.55	81,155.55		
VI	TUBERIA PLUVIAL	13.130	81,814.98	81,814.98	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		81,814.98	81,814.98		
VII	ALCANTARILLA	1.330	8,294.00	8,294.00	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		8,294.00	8,294.00		
VIII	MURO	7.180	44,759.98	44,759.98	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		44,759.98	44,759.98		
IX	SEÑALAMIENTO	2.280	14,236.70	14,236.70	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		14,236.70	14,236.70		
X	TRABAJOS FINALES	5.300	32,998.50	32,998.50	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		32,998.50	32,998.50		
TOTAL		100.000	623,064.63	623,064.63	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	623,064.63 100.000	0.00 0.000	623,064.63 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001125

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
29 DIC 2025 D12FS10017	1.2.3.5.5.2		7,051.47	-7,051.47
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523016 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.5.2			
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
29 DIC 2025 E12FS10021	1.2.3.5.5.2	7,051.47		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	2025 FAIS2523016 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN			
	CTLAHUICOLE DE LA LOC DE SAN VICENTE			
Requisición:	12FS100021			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	03			
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON			
	EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.5.2			
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
Ficha por pagar:	FAIS2523016.			
Acreedor:	0000261			
	GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.			
Contrato:	FAIS2523016			
29 DIC 2025 D12FS10017	1.2.3.5.5.2		79,314.29	-79,314.29
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523016 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	II			
	TERRACERIAS			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.5.2			
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
29 DIC 2025 E12FS10021	1.2.3.5.5.2	79,314.29		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	2025 FAIS2523016 ESTIMACION 1 FINIQUITO			

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001126

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN
CTLAHUICOLE DE LA LOC DE SAN VICENTE

Requisición: 12FS100021

Concepto: II
TERRACERIAS

Fuente financ.: 5.01
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Unidad admin.: 006
OBRAS PÚBLICAS

Programa: 024
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO

Componente: 02
POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS
DE URBANIZACIÓN

Actividad: 03
REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON
EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.

Función: 221
URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.5.2
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Ficha por pagar: FAIS2523016.

Acreeedor: 0000261
GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.

Contrato: FAIS2523016

29 DIC 2025 D12FS10017 1.2.3.5.5.2
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523016 A NO
CAPITALIZABLE

Concepto: III
RELLENOS

Fuente financ.: 5.01
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

C.O.G.: 6.1.5.2
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

29 DIC 2025 E12FS10021 1.2.3.5.5.2 68,856.16 0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
2025 FAIS2523016 ESTIMACION 1 FINIQUITO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN
CTLAHUICOLE DE LA LOC DE SAN VICENTE

Requisición: 12FS100021

Concepto: III
RELLENOS


Fuente financ.: 5.01
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Unidad admin.: 006
OBRAS PÚBLICAS

Programa: 024
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO

Componente: 02
POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS
DE URBANIZACIÓN

Actividad: 03
REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON
EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001127

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN

Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523016.		
Acreedor:	0000261		
	GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.		
Contrato:	FAIS2523016		
29 DIC 2025 D12FS10017	1.2.3.5.5.2	204,583.00	-204,583.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523016 A NO CAPITALIZABLE		
Concepto:	IV		
	PAVIMENTO DE ADOQUIN		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
29 DIC 2025 E12FS10021	1.2.3.5.5.2	204,583.00	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	2025 FAIS2523016 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CTLAHUICOLE DE LA LOC DE SAN VICENTE		
Requisición:	12FS100021		
Concepto:	IV		
	PAVIMENTO DE ADOQUIN		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	03		
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523016.		
Acreedor:	0000261		
	GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.		
Contrato:	FAIS2523016		
29 DIC 2025 D12FS10017	1.2.3.5.5.2	14,236.70	-14,236.70
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523016 A NO CAPITALIZABLE		
Concepto:	IX		
	SEÑALAMIENTO		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001128



OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN			
29 DIC 2025 E12FS10021	1.2.3.5.5.2	14,236.70	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	2025 FAIS2523016 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN		
	CTLAHUICOLE DE LA LOC DE SAN VICENTE		
Requisición:	12FS100021		
Concepto:	IX		
	SEÑALAMIENTO		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	03		
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON		
	EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523016.		
Acreedor:	0000261		
	GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.		
Contrato:	FAIS2523016		
29 DIC 2025 D12FS10017	1.2.3.5.5.2	81,155.55	-81,155.55
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523016 A NO		
	CAPITALIZABLE		
Concepto:	V		
	ALBAÑILERIA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
29 DIC 2025 E12FS10021	1.2.3.5.5.2	81,155.55	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	2025 FAIS2523016 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN		
	CTLAHUICOLE DE LA LOC DE SAN VICENTE		
Requisición:	12FS100021		
Concepto:	V		
	ALBAÑILERIA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001129

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN

Actividad:	03		
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON		
	EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523016.		
Acreeador:	0000261		
	GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.		
Contrato:	FAIS2523016		
29 DIC 2025 D12FS10017	1.2.3.5.5.2	81,814.98	-81,814.98
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523016 A NO		
	CAPITALIZABLE		
Concepto:	VI		
	TUBERIA PLUVIAL		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
29 DIC 2025 E12FS10021	1.2.3.5.5.2	81,814.98	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	2025 FAIS2523016 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN		
	CTLAHUICOLE DE LA LOC DE SAN VICENTE		
Requisición:	12FS100021		
Concepto:	VI		
	TUBERIA PLUVIAL		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	03		
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON		
	EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523016.		
Acreeador:	0000261		
	GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.		
Contrato:	FAIS2523016		
29 DIC 2025 D12FS10017	1.2.3.5.5.2	8,294.00	-8,294.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523016 A NO		
	CAPITALIZABLE		
Concepto:	VII		
	ALCANTARILLA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		




MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001130

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN


C.O.G.:	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
29 DIC 2025 E12FS10021	1.2.3.5.5.2	8,294.00	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	2025 FAIS2523016 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN		
	CTLAHUICOLE DE LA LOC DE SAN VICENTE		
Requisición:	12FS100021		
Concepto:	VII		
	ALCANTARILLA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	03		
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON		
	EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
Ficha por pagar:	FAIS2523016.		
Acreedor:	0000261		
	GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.		
Contrato:	FAIS2523016		
29 DIC 2025 D12FS10017	1.2.3.5.5.2	44,759.98	-44,759.98
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523016 A NO		
	CAPITALIZABLE		
Concepto:	VIII		
	MURO		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.2		
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
29 DIC 2025 E12FS10021	1.2.3.5.5.2	44,759.98	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	2025 FAIS2523016 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN		
	CTLAHUICOLE DE LA LOC DE SAN VICENTE		
Requisición:	12FS100021		
Concepto:	VIII		
	MURO		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001131

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN				
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	03			
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.5.2			
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
Ficha por pagar:	FAIS2523016.			
Acreedor:	0000261			
	GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.			
Contrato:	FAIS2523016			
29 DIC 2025 D12FS10017	1.2.3.5.5.2	32,998.50	-32,998.50	
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523016 A NO CAPITALIZABLE			
Concepto:	X			
	TRABAJOS FINALES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.5.2			
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
29 DIC 2025 E12FS10021	1.2.3.5.5.2	32,998.50	0.00	
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
	2025 FAIS2523016 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CTLAHUICOLE DE LA LOC DE SAN VICENTE			
Requisición:	12FS100021			
Concepto:	X			
	TRABAJOS FINALES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	03			
	REALIZAR CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON EL MODELO DE DESARROLLO URBANO.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.5.2			
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
Ficha por pagar:	FAIS2523016.			
Acreedor:	0000261			
	GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.			
Contrato:	FAIS2523016			
SUMA PERIODO:		623,064.63	623,064.63	0.00
SALDO FINAL:		623,064.63	623,064.63	0.00
=====				



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001132

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523017 REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523017
NOMBRE: REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE
DE LA LOC DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DEACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SAN VICENTE XILOXOCHITLA
UBICACIÓN: CALLE ALSELMO RUIZ
FECHA DE INICIO: 02 OCT 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 2025 FAIS2523017
MONTO ORIGINAL: \$449,814.28
FECHA DE FIRMA: 01 OCT 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: RICARDO GALICIA MORA
DOMICILIO: DEL JARDIN
No. Exterior: S/N No. Interior:
Colonia: SAN DIEGO METEPEC C. P.: 90110
Municipio: TLAXCALA Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2215296949
R. F. C.: GAMR7402274T0
CONTACTO: MUNICIPIO

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$556,995.73

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001133

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523017 REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	556,995.73
TOTAL ASIGNADO.....		556,995.73

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS		
I	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	18.140	101,031.36	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		101,031.36	0.00		
II	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE	53.650	298,842.91	129,985.70	43.496	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		298,842.91	129,985.70		
III	TREN DE DESCARGA	17.300	96,339.00	96,339.00	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		96,339.00	96,339.00		
IV	EQUIPO DE CLORACION	6.790	37,829.15	37,829.15	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		37,829.15	37,829.15		
V	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4.120	22,953.31	22,953.31	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		22,953.31	22,953.31		
TOTAL		100.000	556,995.73	287,107.16	51.546	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	287,107.16 51.546	269,888.57 48.454	556,995.73 100.000

**TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS TLAX.**
2024 - 2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS TLAX.**
2024 - 2027

**SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS TLAX.**
2024 - 2027

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001134

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523017 REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		269,888.57	0.00	269,888.57
04 DIC 2025 D12FS10003	1.2.3.5.3.2		101,031.36	168,857.21
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523017 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	FUENTE DE ABASTECIMIENTO			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL			
04 DIC 2025 D12FS10003	1.2.3.5.3.2		298,842.91	-129,985.70
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523017 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	II			
	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL			
04 DIC 2025 E12FS10003	1.2.3.5.3.2		129,985.70	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523017 ESTIMACION 2 FINIQUITO			
	REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE			
	DE LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA			
Requisición:	12FS100003			
Concepto:	II			
	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL			



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001135

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523017 REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE


Ficha por pagar:	FAIS2523017		
Acreedor:	MNT0061		
	RICARDO GALICIA MORA		
Contrato:	2025 FAIS2523017		
04 DIC 2025 D12FS10003	1.2.3.5.3.2	96,339.00	-96,339.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523017 A NO		
	CAPITALIZABLE		
Concepto:	III		
	TREN DE DESCARGA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.3.2		
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS, ELECT.TEL		
04 DIC 2025 E12FS10003	1.2.3.5.3.2	96,339.00	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	2025 FAIS2523017 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE		
	DE LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA		
Requisición:	12FS100003		
Concepto:	III		
	TREN DE DESCARGA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02		
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,		
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS		
	COMUNIDADES.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.2		
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS, ELECT.TEL		
Ficha por pagar:	FAIS2523017		
Acreedor:	MNT0061		
	RICARDO GALICIA MORA		
Contrato:	2025 FAIS2523017		
04 DIC 2025 D12FS10003	1.2.3.5.3.2	37,829.15	-37,829.15
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523017 A NO		
	CAPITALIZABLE		
Concepto:	IV		
	EQUIPO DE CLORACION		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001136

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523017 REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE				
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL			
04 DIC 2025 E12FS10003	1.2.3.5.3.2	37,829.15		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523017 ESTIMACION 2 FINIQUITO			
	REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE			
	DE LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA			
Requisición:	12FS100003			
Concepto:	IV			
	EQUIPO DE CLORACION			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL			
Ficha por pagar:	FAIS2523017			
Acreedor:	MNT0061			
	RICARDO GALICIA MORA			
Contrato:	2025 FAIS2523017			
04 DIC 2025 D12FS10003	1.2.3.5.3.2	22,953.31		-22,953.31
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523017 A			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	V			
	OBRAS COMPLEMENTARIAS			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL			
04 DIC 2025 E12FS10003	1.2.3.5.3.2	22,953.31		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523017 ESTIMACION 2 FINIQUITO			
	REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE			
	DE LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA			
Requisición:	12FS100003			
Concepto:	V			
	OBRAS COMPLEMENTARIAS			
Fuente financ.:	5.01			



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001137

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523017 REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE

(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
Unidad admin.: 006
OBRAS PÚBLICAS
Programa: 024
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO
Componente: 02
POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS
DE URBANIZACIÓN
Actividad: 02
AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS
COMUNIDADES.
Función: 221
URBANIZACIÓN
C.O.G.: 6.1.3.2
CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS, ELECT.TEL
Ficha por pagar: FAIS2523017
Acreedor: MNT0061
RICARDO GALICIA MORA
Contrato: 2025 FAIS2523017

SUMA PERIODO:.....	287,107.16	556,995.73	-269,888.57
SALDO FINAL:.....	556,995.73	556,995.73	0.00

=====



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001138

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523018 AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523018

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO EN
C REFORMA Y C LOS PINOS EN SAN VICENTE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SAN VICENTE XILOXOCHITLA
UBICACIÓN: CALLE REFORMA
FECHA DE INICIO: 14 NOV 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523018
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 NOV 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: RICARDO GALICIA MORA
DOMICILIO: DEL JARDIN
No. Exterior: S/N No. Interior:
Colonia: SAN DIEGO METEPEC C. P.: 90110
Municipio: TLAXCALA Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2215296949
R. F. C.: GAMR7402274T0
CONTACTO: MUNICIPIO

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$248,778.15
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001139

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523018 AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	248,778.15
TOTAL ASIGNADO.....		248,778.15

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
I	PRELIMINARES	4.710	11,722.90	11,722.90	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		11,722.90	11,722.90		
II	EXCAVACIONES	18.130	45,108.11	45,108.11	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		45,108.11	45,108.11		
III	LINEAS DE RIEGO	59.810	148,802.72	148,802.72	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		148,802.72	148,802.72		
IV	ALBAÑILERIA	2.370	5,899.70	5,899.70	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		5,899.70	5,899.70		
V	PAVIMENTO	10.650	26,483.38	26,483.38	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		26,483.38	26,483.38		
VI	TRABAJOS FINALES	4.330	10,761.34	10,761.34	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		10,761.34	10,761.34		
TOTAL		100.000	248,778.15	248,778.15	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	248,778.15 100.000	0.00 0.000	248,778.15 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2025 - 2027


TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2025 - 2027

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001140

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523018 AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2025 D12FS10021	1.2.3.6.3.2		11,722.90	-11,722.90
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523018 A NO			
	CAPITABILIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
30 DIC 2025 E12FS10025	1.2.3.6.3.2	11,722.90		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523018 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO			
	DE LA LOC DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA			
Requisición:	12FS100025			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	022			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
Ficha por pagar:	FAIS2523018.			
Acreedor:	MNT0061			
Contrato:	2024-26			
30 DIC 2025 D12FS10021	1.2.3.6.3.2			
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523018 A NO			
	CAPITABILIZABLE			
Concepto:	II			
	EXCAVACIONES			
Fuente financ.:	5.01			



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001141

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523018 AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO				
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
30 DIC 2025 E12FS10025	1.2.3.6.3.2	45,108.11		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523018 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO			
	DE LA LOC DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA			
Requisición:	12FS100025			
Concepto:	II			
	EXCAVACIONES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
Ficha por pagar:	FAIS2523018.			
Acreeedor:	MNT0061			
	RICARDO GALICIA MORA			
Contrato:	FAIS2523018			
30 DIC 2025 D12FS10021	1.2.3.6.3.2	148,802.72		-148,802.72
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523018 A NO			
	CAPITABILIZABLE			
Concepto:	III			
	LINEAS DE RIEGO			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
30 DIC 2025 E12FS10025	1.2.3.6.3.2	148,802.72		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523018 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO			
	DE LA LOC DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA			
Requisición:	12FS100025			
Concepto:	III			
	LINEAS DE RIEGO			

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001142

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523018 AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO

Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02 AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS COMUNIDADES.		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
Ficha por pagar:	FAIS2523018.		
Acreeedor:	MNT0061 RICARDO GALICIA MORA		
Contrato:	FAIS2523018		
30 DIC 2025 D12FS10021	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523018 A NO CAPITABILIZABLE	5,899.70	-5,899.70
Concepto:	IV ALBAÑILERIA		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
30 DIC 2025 E12FS10025	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 2025 FAIS2523018 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO DE LA LOC DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA 12FS100025		0.00
Requisición:	IV ALBAÑILERIA		
Concepto:	IV ALBAÑILERIA		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02 AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS		



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

• 001143

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523018 AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO

Función:	COMUNIDADES. 221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
Ficha por pagar:	FAIS2523018.		
Acreedor:	MNT0061 RICARDO GALICIA MORA		
Contrato:	FAIS2523018		
30 DIC 2025 D12FS10021	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523018 A NO CAPITABILIZABLE	26,483.38	-26,483.38
Concepto:	V PAVIMENTO		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
30 DIC 2025 E12FS10025	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 2025 FAIS2523018 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO DE LA LOC DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA	26,483.38	0.00
Requisición:	12FS100025		
Concepto:	V PAVIMENTO		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02 AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS COMUNIDADES.		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
Ficha por pagar:	FAIS2523018.		
Acreedor:	MNT0061 RICARDO GALICIA MORA		
Contrato:	FAIS2523018		
30 DIC 2025 D12FS10021	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523018 A NO	10,761.34	-10,761.34

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001144

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523018 AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO				
	CAPITABILIZABLE			
Concepto:	VI			
	TRABAJOS FINALES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
30 DIC 2025 E12FS10025	1.2.3.6.3.2	10,761.34		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523018 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	AMPLIACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO			
	DE LA LOC DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA			
Requisición:	12FS100025			
Concepto:	VI			
	TRABAJOS FINALES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
Ficha por pagar:	FAIS2523018.			
Acreedor:	MNT0061			
	RICARDO GALICIA MORA			
Contrato:	FAIS2523018			
SUMA PERIODO:.....		248,778.15	248,778.15	0.00
SALDO FINAL:.....		248,778.15	248,778.15	0.00
=====				



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001145

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523019 CONST DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523019
NOMBRE: CONST DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: CONST DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
DE LA LOC DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 OCT 2025
FECHA DE LICITACIÓN: 27 OCT 2025
FECHA DE FALLO: 29 OCT 2025

LOCALIDAD: SANTO TOMAS LA CONCORDIA
UBICACIÓN: UNIDAD DEPORTIVA LA CONCORDIA
FECHA DE INICIO: 30 OCT 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DIC 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523019
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 15 OCT 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIO MORALES SILVA
DOMICILIO: CANAL SAN IGNACIO

No. Exterior: 7 No. Interior:

Colonia: SAN MIGUEL XOCHITECATITLA C. P. 90720

Municipio: NATIVITAS Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO: 24663108430

R. F. C.: MOSM880118576

CONTACTO: MUNICIPIO

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,085,747.88

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:



CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001146

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523019 CONST DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	2,085,747.88
TOTAL ASIGNADO.....		2,085,747.88

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
I	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION	32.960	687,515.64	687,515.64 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		687,515.64	687,515.64
II	PERFORACION EXPLORATORIA	44.070	919,286.26	919,286.26 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		919,286.26	919,286.26
III	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA	22.970	478,945.98	478,945.98 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		478,945.98	478,945.98
TOTAL		100.000	2,085,747.88	2,085,747.88 100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	2,085,747.88 100.000	0.00 0.000	2,085,747.88 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001147

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523019 CONST DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====		=====	=====	=====
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
11 DIC 2025 E12FS10008	1.2.3.6.3.2	687,515.64		687,515.64
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523019 EST 1 CONSTRUCCION DE			
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA			
	LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA			
Requisición:	12FS100008			
Concepto:	I			
	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
Ficha por pagar:	FAIS2523019.			
Acreeedor:	MNT0106			
	MARIO MORALES SILVA			
Contrato:	FAIS2523019			
23 DIC 2025 D12FS10006	1.2.3.6.3.2		687,515.64	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523019 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
11 DIC 2025 E12FS10008	1.2.3.6.3.2	740,116.03		740,116.03
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523019 EST 1 CONSTRUCCION DE			
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA			
	LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA			
Requisición:	12FS100008			
Concepto:	II			



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001148

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523019 CONST DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE			
	PERFORACION EXPLORATORIA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02		
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,		
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS		
	COMUNIDADES.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.3.2		
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
Ficha por pagar:	FAIS2523019.		
Acreeedor:	MNT0106		
	MARIO MORALES SILVA		
Contrato:	FAIS2523019		
23 DIC 2025 D12FS10006	1.2.3.6.3.2	9,286.26	-179,170.23
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523019 A NO		
	CAPITALIZABLE		
Concepto:	II		
	PERFORACION EXPLORATORIA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.3.2		
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
23 DIC 2025 E12FS10009	1.2.3.6.3.2	179,170.23	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	2025 FAIS2523019 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA		
	POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA		
Requisición:	12FS100009		
Concepto:	II		
	PERFORACION EXPLORATORIA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02		
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,		

001149

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523019 CONST DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS COMUNIDADES.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.3.2		
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
Ficha por pagar:	FAIS2523019.		
Acreeedor:	MNT0106		
	MARIO MORALES SILVA		
Contrato:	FAIS2523019		
23 DIC 2025 D12FS10006	1.2.3.6.3.2	478,945.98	-478,945.98
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523019 A NO CAPITALIZABLE		
Concepto:	III		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.3.2		
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
23 DIC 2025 E12FS10009	1.2.3.6.3.2	478,945.98	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	2025 FAIS2523019 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA		
	12FS100009		
Requisición:	III		
Concepto:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02		
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS COMUNIDADES.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.3.2		
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
Ficha por pagar:	FAIS2523019.		
Acreeedor:	MNT0106		
	MARIO MORALES SILVA		
Contrato:	FAIS2523019		
SUMA PERIODO:.....		2,085,747.88	2,085,747.88 0.00
SALDO FINAL:.....		2,085,747.88	2,085,747.88 0.00
=====			

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001150

OBRA/ACCIÓN NO. 2025 FAIS2523021 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523021
NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
DE BAJA TENSION EN C VEREDA Y C SAN MIGU
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SANTA MARIA NATIVITAS
UBICACIÓN: CALLE VEREDA Y CALLE SAN MIGUEL
FECHA DE INICIO: 15 OCT 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 NOV 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523021
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 OCT 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO

No. Exterior: 6 No. Interior:

Colonia: 1RA SECCION SAN JOSE TEACALCO C

Municipio: SAN JOSE TEACALCO Entidad F

TELEFONO: 2441129317

R. F. C.: HEGF850514TP3

CONTACTO: N/A

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$136,536.29

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001151

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523021 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	136,536.29
TOTAL ASIGNADO.....		136,536.29

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
I	PRELIMINARES	3.180	4,337.01	4,337.01 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,337.01	4,337.01
II	POSTES	44.020	60,097.72	60,097.72 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		60,097.72	60,097.72
III	INSTALACIONES ESPECIALES	52.800	72,101.56	72,101.56 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		72,101.56	72,101.56
TOTAL		100.000	136,536.29	136,536.29 100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	136,536.29 100.000	0.00 0.000	136,536.29 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%



TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001152

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523021 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====		=====	=====	=====
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2025 D12FS10020	1.2.3.5.3.2		4,337.01	-4,337.01
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523021 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS,ELECT.TEL			
30 DIC 2025 E12FS10024	1.2.3.5.3.2			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523021 AMPLIACION DE RED DE			
	ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN			
	C VEREDA Y C SAN MIGUEL EN NATIVITAS			
Requisición:	12FS100024			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS,ELECT.TEL			
Ficha por pagar:	FAIS2523021.			
Acreedor:	0006917			
	FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Contrato:	FAIS2523021			
30 DIC 2025 D12FS10020	1.2.3.5.3.2		60,097.72	-60,097.72
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523021 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	II			
	POSTES			
Fuente financ.:	5.01			



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001153

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523021 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA				
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.1.3.2		
		CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS, ELECT.TEL		
30 DIC 2025	E12FS10024	1.2.3.5.3.2	60,097.72	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,		
		ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
		2025 FAIS2523021 AMPLIACION DE RED DE		
		ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN		
		C VEREDA Y C SAN MIGUEL EN NATIVITAS		
Requisición:		12FS100024		
Concepto:		II		
		POSTES		
Fuente financ.:		5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:		02		
		POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
		DE URBANIZACIÓN		
Actividad:		02		
		AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,		
		ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS		
		COMUNIDADES.		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.1.3.2		
		CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS, ELECT.TEL		
Ficha por pagar:		FAIS2523021.		
Acreeedor:		0006917		
		FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ		
Contrato:		FAIS2523021		
30 DIC 2025	D12FS10020	1.2.3.5.3.2	72,101.56	-72,101.56
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,		
		ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
		TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523021 A NO		
		CAPITALIZABLE		
Concepto:		III		
		INSTALACIONES ESPECIALES		
Fuente financ.:		5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.1.3.2		
		CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS, ELECT.TEL		
30 DIC 2025	E12FS10024	1.2.3.5.3.2	72,101.56	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,		
		ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
		2025 FAIS2523021 AMPLIACION DE RED DE		
		ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN		
		C VEREDA Y C SAN MIGUEL EN NATIVITAS		
Requisición:		12FS100024		
Concepto:		III		
		INSTALACIONES ESPECIALES		



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001154

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523021 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

Fuente financ.: 5.01
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
Unidad admin.: 006
OBRAS PÚBLICAS
Programa: 024
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO
Componente: 02
POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS
DE URBANIZACIÓN
Actividad: 02
AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS
COMUNIDADES.
Función: 221
URBANIZACIÓN
C.O.G.: 6.1.3.2
CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS, ELECT.TEL
Ficha por pagar: FAIS2523021.
Acreeedor: 0006917
FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ
Contrato: FAIS2523021



SUMA PERIODO:.....	136,536.29	136,536.29	0.00
SALDO FINAL:.....	136,536.29	136,536.29	0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001155

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523022 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 2025 FAIS2523022
NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
DE BAJA TENSION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SANTIAGO MICHAC
UBICACIÓN: CALLE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS
FECHA DE INICIO: 01 NOV 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOV 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAIS2523022
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 15 OCT 2025
FECHA VENCE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ

DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 6 No. Interior:
Colonia: 1RA SECCION SAN JOSE TEACALCO C. P.: 90495
Municipio: SAN JOSE TEACALCO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2441129317
R. F. C.: HEGF850514TP3
CONTACTO: N/A

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$156,614.74

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001156

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523022 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	156,614.74
TOTAL ASIGNADO.....		156,614.74


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
I	PRELIMINARES	38.140	59,737.73	59,737.73 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		59,737.73	59,737.73
II	VESTIDO DE ESTRUCTURAS	7.000	10,957.37	10,957.37 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		10,957.37	10,957.37
III	TENDIDO DE LINEAS	48.490	75,937.95	75,937.95 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		75,937.95	75,937.95
IV	RETENIDA	3.040	4,757.91	4,757.91 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,757.91	4,757.91
V	TIERRAS	1.510	2,370.18	2,370.18 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,370.18	2,370.18
VI	TRAMITES	1.820	2,853.60	2,853.60 100.000 100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,853.60	2,853.60
TOTAL		100.000	156,614.74	156,614.74 100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	156,614.74 100.000	0.00 0.000	156,614.74 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

19 DIC 2025: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100%



MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001157

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523022 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
19 DIC 2025 D12FS10008	1.2.3.6.3.2		59,737.73	-59,737.73
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523022 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
19 DIC 2025 E12FS10012	1.2.3.6.3.2	59,737.73		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	2025 FAIS2523022 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA			
	DE BAJA TENSION EN SANTIAGO MICHAC			
Requisición:	12FS100012			
Concepto:	I			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.			
	SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS			
	DE URBANIZACIÓN			
Actividad:	02			
	AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,			
	ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS			
	COMUNIDADES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.3.2			
	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.			
Ficha por pagar:	FAIS2523022.			
Acreedor:	0006917			
	FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Contrato:	FAIS2523022			
19 DIC 2025 D12FS10008	1.2.3.6.3.2		10,957.37	-10,957.37
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523022 A NO			
	CAPITALIZABLE			
Concepto:	II			
	VESTIDO DE ESTRUCTURAS			
Fuente financ.:	5.01			

001158

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523022 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA				
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.2.3.2		
		CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
19 DIC 2025	E12FS10012	1.2.3.6.3.2	10,957.37	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 2025 FAIS2523022 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN SANTIAGO MICHAC		
Requisición:		12FS100012		
Concepto:		II		
		VESTIDO DE ESTRUCTURAS		
Fuente financ.:		5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		02		
		POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:		02		
		AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS COMUNIDADES.		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.2.3.2		
		CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
Ficha por pagar:		FAIS2523022.		
Acreeedor:		0006917		
		FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ		
Contrato:		FAIS2523022		
19 DIC 2025	D12FS10008	1.2.3.6.3.2	75,937.95	-75,937.95
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523022 A NO CAPITALIZABLE		
Concepto:		III		
		TENDIDO DE LINEAS		
Fuente financ.:		5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.2.3.2		
		CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
19 DIC 2025	E12FS10012	1.2.3.6.3.2	75,937.95	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 2025 FAIS2523022 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN SANTIAGO MICHAC		
Requisición:		12FS100012		
Concepto:		III		
		TENDIDO DE LINEAS		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS TLAX.
2024 - 2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS TLAX.
2024 - 2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO MUNICIPAL
NATIVITAS TLAX.
2024 - 2025

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001159

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523022 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02 AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS COMUNIDADES.		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
Ficha por pagar:	FAIS2523022.		
Acreedor:	0006917 FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ		
Contrato:	FAIS2523022		
19 DIC 2025 D12FS10008	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523022 A NO CAPITALIZABLE	4,757.91	-4,757.91
Concepto:	IV RETENIDA		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
19 DIC 2025 E12FS10012	1.2.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 2025 FAIS2523022 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN SANTIAGO MICHAC	4,757.91	0.00
Requisición:	12FS100012		
Concepto:	IV RETENIDA		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02 AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS		

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001160

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523022 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

Función:	COMUNIDADES. 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL. FAIS2523022.		
Acreedor:	0006917 FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ		
Contrato:	FAIS2523022		
19 DIC 2025 D12FS10008	1.2.3.6.3.2	2,370.18	-2,370.18
Concepto:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523022 A NO CAPITALIZABLE		
Fuente financ.:	V TIERRAS 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL. 1.2.3.6.3.2	2,370.18	0.00
19 DIC 2025 E12FS10012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 2025 FAIS2523022 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN SANTIAGO MICHAC		
Requisición:	12FS100012		
Concepto:	V TIERRAS		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Actividad:	02 AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS COMUNIDADES.		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.3.2 CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL. FAIS2523022.		
Ficha por pagar:	0006917 FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ		
Contrato:	FAIS2523022		
19 DIC 2025 D12FS10008	1.2.3.6.3.2	2,853.60	-2,853.60
Concepto:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION TRASPASO DE OBRA 2025 FAIS2523022 A NO		

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA
RFC: MNT850101HP6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

001161

OBRA/ACCIÓN No. 2025 FAIS2523022 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

		CAPITALIZABLE		
Concepto:		VI		
		TRAMITES		
Fuente financ.:		5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.2.3.2		
		CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
19 DIC 2025	E12FS10012	1.2.3.6.3.2	2,853.60	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,		
		ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
		2025 FAIS2523022 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		
		DE BAJA TENSION EN SANTIAGO MICHAC		
Requisición:		12FS100012		
Concepto:		VI		
		TRAMITES		
Fuente financ.:		5.01		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.		
		SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:		02		
		POBLACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS Y OBRAS		
		DE URBANIZACIÓN		
Actividad:		02		
		AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,		
		ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE EN LAS		
		COMUNIDADES.		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.2.3.2		
		CONST.OBR.ABAS.AGUA PET.GAS,ELEC.Y TEL.		
Ficha por pagar:		FAIS2523022.		
Acreedor:		0006917		
		FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ		
Contrato:		FAIS2523022		
SUMA PERIODO:			156,614.74	156,614.74
				0.00
SALDO FINAL:			156,614.74	156,614.74
				0.00

